



RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA RV/CSB/010/2016

**Assunto: Acompanhamento do Plano Municipal
de Saneamento Básico do Município de Ibicuitinga**

COORDENADORIA DE SANEAMENTO BÁSICO

Fortaleza – CE

Dezembro/2016

1 . FATO GERADOR

Considerando que o Município de Ibicuitinga já elaborou seu Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que a CAGECE (Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará) é a delegatária da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município;

Considerando o advento da Lei Federal nº 11.445/2007, que incumbiu o ente regulador e fiscalizador, dos serviços a verificação do cumprimento dos PMSBs, na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais (par. único, art. 20) e que o PMSB deve ser de responsabilidade do titular dos serviços e de cumprimento obrigatório pelo prestador de serviços no caso da delegação (art. 19, caput e §6º);

Considerando o Decreto Federal nº 7.217/2010, regulamentador da Lei nº 11.445/2007, de que o disposto no plano de saneamento básico é vinculado para o Poder Público que elaborou e para os delegatários dos serviços públicos de saneamento básico.

Considerando que a Lei Estadual nº 14.394/2009 estabeleceu como competência da ARCE exercer a regulação, a fiscalização e o monitoramento dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, prestados pela CAGECE (art. 4º).

Considerando, ainda, a Lei Complementar nº 162/2016 que instituiu a Política de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado do Ceará.

A ARCE realizou a ação de acompanhamento e verificação do cumprimento do PMSB do Município de Ibicuitinga, cujas atividades incluiu uma reunião com gestores municipais realizada em 11/11/2016.

2 . OBJETIVO

Verificar o andamento dos programas, projetos e ações para alcance dos seus objetivos e metas estabelecidos no PMSB do Município de Ibicuitinga.

3 . HISTÓRICO

Esta é a terceira vez que a Coordenadoria de Saneamento Básico (CSB) da ARCE realiza ação de acompanhamento para verificação do cumprimento do PMSB de Ibicuitinga, com visita ao município e reunião com gestores públicos. De fato, as ações anteriores ocorreram em 25/09/2014¹ e 20/11/2015², respectivamente.

Essa atividade permitirá o acompanhamento de programas, projetos e ações para consecução dos objetivos e metas estabelecidas no PMSB, por meio do levantamento de dados dos projetos executados e dos que estavam em andamento, bem como daqueles que não haviam sido, ainda, iniciados, a fim de detectar os níveis de execução e orientar os responsáveis acerca dos principais problemas observados.

Para a realização desta ação de acompanhamento, a Coordenadoria de Saneamento Básico da ARCE, no dia 07 de outubro de 2016, enviou ofício OF/CSB/1311/2016 (Processo PCSB/CSB/0219/2016), informando sobre a realização das atividades de acompanhamento e verificação do cumprimento do PMSB do Município de Ibicuitinga, para encontro com representantes do poder Público Municipal e da CAGECE, na Sede da Prefeitura Municipal.

4 . DESCRIÇÕES DOS FATOS LEVANTADOS

A reunião para acompanhamento do PMSB foi realizada no dia 11 de novembro de 2016, às 14h30, na Prefeitura Municipal de Ibicuitinga, com os seguintes participantes: Sr. Genilson Gean Maia (Sec. de Obras), José Antônio Nunes Júnior (Inspetor de Obras), Madean Maira Rabelo Nobre (Agente Administrativa), Sr. Kertyson Dennis Menezes Girão

¹ <http://www.arce.ce.gov.br/index.php/relatorios-de-fiscalizacao-saneamento/acompanhamento-de-pmsb/category/332-verificacao-do-cumprimento-do-pmsb?download=6119%3Arfcsb00662014-acompanhamento-de-pmsb>

² Disponível em <http://www.arce.ce.gov.br/index.php/relatorios-de-fiscalizacao-saneamento/acompanhamento-de-pmsb/category/332-verificacao-do-cumprimento-do-pmsb?download=7564%3Arfcsb00662015-anexado-em-25012016>

(Gestor de Núcleo da CAGECE de Ibicuitinga), Márcio Gomes (Analista da ARCE). Esta reunião teve o objetivo de detectar os níveis de execução do PMSB do Município de Ibicuitinga e orientar os responsáveis acerca dos principais problemas observados. (**Foto 1**).



Foto 1 - Da esquerda para a direita: Sr. Genilson Gean Maia (Sec. de Obras), José Antônio Nunes Júnior (Inspetor de Obras), Sr. Kertyson Dennis Menezes Girão (Gestor de Núcleo da CAGECE de Ibicuitinga), Márcio Gomes (Analista da ARCE) e Madean Maira Rabelo Nobre (Agente Administrativa).

4.1. Visita à Prefeitura

Os tópicos a seguir apresentam as metas e prazos dos programas, projetos e suas respectivas ações executadas rumo à universalização de cada componente do setor de saneamento básico.

4.2. Programa Acessibilidade ao Saneamento Básico

a) Abastecimento de Água

- **Projeto 1 – Ampliação do SAA operado pela CAGECE nos distritos Sede, Açude dos Pinheiros, Canindezinho e Viçosa**

O Quadro 1 apresenta as três ações propostas para este projeto, com metas para 2013, 2016, 2020, 2024, 2028 e 2032.

As Ações A1 a A3 estão com a situação de “cumpridas dentro dos prazos”. Na ação A1 foi elaborado o projeto para o atendimento à Meta M2.

Na Ação A2, a CAGECE relata que houve um incremento de 734 novas ligações hidrometradas representando 23,95% da meta, superior a meta estipulada para o ano de 2016. Entretanto o município precisa ampliar a cobertura em 76,05% para o cumprimento da meta total.

Na Ação, A3 a CAGECE relata que realizou campanhas educativas e ambientais de incentivo ao consumo racional de água.

Quadro 1 – Ações e Metas do Projeto 1

Projeto 1		Meta/Prazo	2014	2015	2016	Situação	Fonte
A1	Elaborar 3 projetos executivos para atendimento das metas estabelecidas de curto, médio e longo prazos.	M1 33% até 2013; 66% até 2016; 100% até 2024	1 (um) projeto executivo elaborado aguardando escavações da Prefeitura.	1 (um) projeto concluído e 1 (um) projeto elaborado.	O projeto elaborado para atendimento da meta M2.	Cumprida dentro do prazo	CAGECE
A2	Ampliar a cobertura para atender 3.065 novas ligações hidrometradas; Sede - 1.882; Açude dos Pinheiros - 560; Canindezinho - 289 e Viçosa (Sede - 195 e Currais - 139).	M2 20% até 2016; 38% até 2020; 55% até 2024; 78% até 2028; 100% até 2032	-	Quantidade de novas ligações não informada.	Incremento de 734 ligações: Sede - 616; Canindezinho (Antônio Pereira - 25/Canindezinho - 26); Viçosa (Currais - 22/Viçosa - 45)	Cumprida dentro do prazo	CAGECE
A3	Realizar campanha de incentivo e disseminação da importância do consumo e uso racional de água tratada	M3 100% até 2016	-	-	Foi realizado campanha de incentivo ao consumo racional de água.	Cumprida dentro do prazo	CAGECE

- **Projeto 2 – Ampliação gradual da cobertura e atendimento pelo SISAR na zona rural de Açude dos Pinheiros e Canindezinho**

O Quadro 2 apresenta as duas ações propostas para este projeto, com as metas para 2013, 2016, 2020, 2024, 2028 e 2032.

A Ação A1 está com a situação de “não iniciada e dentro do prazo”, posto que não foram relatadas informações pela Prefeitura para o seu atendimento.

A Ação A2 está com a situação de “em andamento e dentro do prazo”. A Prefeitura informou que houve um incremento de 33 novas ligações hidrometradas no distrito de Viçosa representando 46,5% da meta total. Bem como acrescenta que a obra da localidade de Melancia foi finalizada, porém não está em funcionamento.

Quadro 2 – Ações e Metas do Projeto 2.

Projeto 2		Meta/Prazo		2014	2015	2016	Situação	Fonte
A1	Elaborar 3 projetos executivos para atendimento das metas estabelecidas de curto, médio e longo prazos	M1	33% até 2013; 66% até 2016; 100% até 2024	-	-	Sem informações	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A2	Ampliar a cobertura para atender 71 novas ligações hidrometradas (Açude dos Pinheiros: 36; Canindezinho: 35).	M2	20% até 2016; 39% até 2020; 57% até 2024; 78% até 2028; 100% até 2032	Sistema da localidade de Muquém substituído e operado pelo SISAR.	Novo SAA da localidade de Melancia não finalizado.	Incremento de 33 ligações no distrito de Viçosa. A obra da localidade de Melancia foi finalizada, porém não está em funcionamento.	Em andamento e dentro do prazo	Prefeitura Municipal

- **Projeto 3 – Ampliação da cobertura do SAA no distrito Chile**

O Quadro 3 apresenta as duas ações propostas para este projeto, com as metas de curto prazo que vão até 2016.

A Ação A1 está com a situação de “cumprida fora do prazo”, a prefeitura informa que está aguardando a transferência do projeto São José para o SISAR.

A Ação A2 está com a situação de “em andamento e dentro do prazo”. A Prefeitura informou que existe um sistema de abastecimento que está desativado. Desta forma, o abastecimento é realizado por 2 (dois) carros pipa que atende 112 cisternas particulares.

Quadro 3 – Ações e Metas do Projeto 3.

Projeto 3		Meta/Prazo		2014	2015	2016	Situação	Fonte
A1	Elaborar projeto executivo para atendimento das metas estabelecidas de curto prazo	M1	100% até 2013	Não informado	Não informado	Aguardando a transferência do projeto São José para o SISAR.	Cumprida fora do prazo	Prefeitura Municipal
A2	Ampliar a cobertura para atender 31 novas ligações hidrometradas (zona urbana - 26 e zona rural - 5)	M2	100% até 2016	Abastecimento realizado por carros pipa.	Abastecimento realizado por carros pipa.	Existe um sistema de abastecimento, porém está desativado e o abastecimento é realizado por 2 (dois) carros pipa que atende 112 cisternas particulares.	Em andamento e dentro do prazo	Prefeitura Municipal

- **Projeto 4 – Implantação e ampliação gradual de solução individual de abastecimento de água para a população difusa da zona rural dos distritos Canindezinho, Chile e Viçosa**

O Quadro 4 apresenta as duas ações propostas para este projeto, com as metas de curto e médio prazos para 2016, 2020 e 2024.

A Ação A1 está com a situação de “cumprida dentro do prazo”, a Prefeitura relatou que foram instaladas 451 cisternas cumprindo 62% da meta total. Esse valor torna-se superior ao estipulado para o ano de 2016.

A Ação A2 está com a situação de “cumprida dentro do prazo”, posto que houve treinamento na entrega das cisternas.

Quadro 4 – Ações e Metas do Projeto 4.

Projeto 4		Meta/Prazo		2014	2015	2016	Situação	Fonte
A1	Construir 726 cisternas (Canindezinho - 334; Chile - 255 e Viçosa - 136)	M1	47% até 2016; 74% até 2020; 100% até 2024	95% 692 cisternas	Previsão de instalação de mais 300 cisternas.	Foram instaladas 451 cisternas na zona rural dos distritos (Canindezinho - 209; Chile - 52 e Viçosa - 190;)	Cumprida dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A2	Realizar treinamento para manutenção e uso adequado das cisternas.	M2	51% até 2016; 100% até 2020	Considera-se que por ocasião do recebimento as famílias receberam treinamento.	-	houve treinamento na entrega das cisternas.	Cumprida dentro do prazo	Prefeitura Municipal

b) Esgotamento Sanitário

• **Projeto 5 – Ampliação do SES no distrito Sede**

O Quadro 5 apresenta as quatro ações propostas para este projeto, com as respectivas metas para 2013 até 2033.

A Ação A1 está com a situação de “em andamento e dentro do prazo”. Segundo informações da Prefeitura, o projeto executivo da FUNASA de SES está parado aguardando recursos.

As Ações A2 a A4 estão com a situação de “não iniciadas e dentro dos prazos”, considerando que não foram relatadas informações pela Prefeitura, a respeito do cumprimento das metas.

Quadro 5 – Ações e Metas do Projeto 5.

Projeto 5		Meta/Prazo	2014	2015	2016	Situação	Fonte
A1	Elaborar 3 projetos executivos para atendimento das metas estabelecidas de médio e longo prazos	M1 33% até 2013; 66% até 2016; 100% até 2024	Nenhum projeto executivo elaborado.	Existe 1 (um) projeto executivo da FUNASA em fase de licitação.	O projeto executivo da FUNASA de SES está parado aguardando recursos.	Em andamento e dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A2	Ampliar a cobertura para atender 3.179 novas ligações	M2 39% até 2016; 59% até 2020; 79% até 2028; 89% até 2028; 100% até 2032	-	Não informado.	Sem informações	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A3	Construir 795 fossas sépticas em domicílios particulares da zona urbana do distrito Sede.	M3 16% até 2016; 37% até 2020; 59% até 2024; 80% até 2028; 100% até 2033	-	Não informado.	Sem informações	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A4	Realizar campanha de incentivo e disseminação da importância da destinação adequada dos esgotos	M4 100% até 2024	-	Não informado.	Sem informações	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal

- **Projeto 6 – Construção de fossas sépticas e sumidouros para a população difusa no município de Ibicuitinga**

O Quadro 6 apresenta as duas ações propostas para este projeto, com as metas para 2016, 2020 e 2024.

As Ações A1 e A2 estão com as situações de “em andamento e dentro dos prazos”. Na Ação A1 foram construídas 28 fossas sépticas nos distritos Sede, Viçosa e Canindezinho.

Na Ação A2 estão sendo realizados treinamentos a medida que as fossas sépticas estão sendo entregues.

Quadro 6 – Ações e Metas do Projeto 6.

Projeto 6		Meta/Prazo	2014		2016	Situação	Fonte	
A1	Construir 2.591 fossa séptica e sumidouro (Açude dos Pinheiros: zona urbana - 217 e zona rural - 420; Canindezinho: zona urbana - 209 e zona rural - 622; Chile: zona urbana - 67 e zona rural - 327; Viçosa: zona urbana - 188 e zona rural - 541)	M1	43% até 2016; 72% até 2020; 100% até 2024	Não iniciada.	Não iniciada.	Construção de 28 fossa séptica nos distritos Sede, Viçosa e Canindezinho.	Em andamento e dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A2	Realizar treinamento para uso devido e manutenção das fossas sépticas e sumidouros.	M2	50% até 2016; 100% até 2020	-	-	Treinamento realizado na ocasião da entrega das fossas sépticas.	Em andamento e dentro do prazo	Prefeitura Municipal

- **Projeto 7 – Construção de kits sanitários em domicílios particulares do município de Ibicuitinga**

O Quadro 7 apresenta as duas ações propostas para este projeto, com as metas de curto prazo até 2016.

As Ações A1 e A2 estão com as situações de “em andamento e dentro dos prazos”. Na Ação A1, foram construídos 28 kits sanitários no distrito Sede, representando 12,45% da meta total.

Na Ação A2, estão sendo realizados treinamentos a medida que os kits sanitários estão sendo entregues.

Quadro 7 – Ações e Metas do Projeto 7.

Projeto 7		Meta/Prazo		2014	2015	2016	Situação	Fonte
A1	Construir 225 kit sanitários em domicílios partculares (Sede: zona urbana - 16; Açude dos Pinheiros - 31; Canidezinho: zona rural - 47; Chile: zona rural - 61 e Viçosa: zona rural - 70)	M1	100% até 2016	Não iniciada.	Não iniciada.	Construção de 28 kit sanitários no distrito Sede.	Em andamento e dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A2	Realizar 2 campanhas informativas para uso devido das interações sanitárias.	M2	100% até 2016	Não iniciada.	Não iniciada.	Treinamento realizado na ocasião da entrega dos kit sanitários.	Em andamento e dentro do prazo	Prefeitura Municipal

c) Resíduos Sólidos

- **Projeto 8 – Ampliação gradual da coleta de resíduos sólidos do município de Ibicuitinga**

O Quadro 8 apresenta a uma ação proposta para este projeto, com a respectiva meta para 2016, 2020, 2024, 2028 e 2032.

A Ação A1 está com a situação de “cumprida dentro do prazo”. Segundo a Prefeitura 1000 domicílios são atendidos pela coleta seletiva, cumprindo 46% da meta total, entretanto atendendo um valor superior a meta estipulada para o ano de 2016.

Quadro 8 – Ação e Meta do Projeto 8

Projeto 8		Meta/Prazo		2014	2015	2016	Situação	Fonte
A1	Ampliar a cobertura da coleta para atender 2.165 domicílios (Sede - 1.536; Açude dos Pinheiros - 178; Canidezinho - 196; Chile - 108 e Viçosa - 147)	M1	35% até 2016; 49% até 2020; 64% até 2024; 82% até 2028; 100% até 2032	Quantidade de domicílios não informada.	Quantidade de domicílios não informada.	1.000 domicílios são atendidos pela coleta seletiva.	Cumprida dentro do prazo	Prefeitura Municipal

4.3. Programa de Melhorias Operacionais e da Qualidade

a) Abastecimento de Água

- **Projeto 1 – Adequar o fornecimento e a qualidade da água distribuída pelo SAA da CAGECE do distrito Sede**

O Quadro 9 apresenta a ação proposta para este projeto, com a meta para 2016.

A Ação A1 está com a situação de “cumprida dentro do prazo”, haja vista que a CAGECE informou que a adutora emergencial de engate rápido foi concluída e foram perfurados poços na Sede e em diversos distritos.

Quadro 9 – Ação e Meta do Projeto 1.

Projeto 1		Meta/Prazo		2014	2015	2016	Situação	Fonte
A1	Solucionar o problema de falta de continuidade e baixa pressão na rede de abastecimento.	M1	100% até 2016	1 (um) projeto executivo para construção de nova adutora de água bruta.	Fase final da construção da adutora emergencial de engate rápido. Poço perfurados na sede e em diversos distritos.	A adutora emergencial de engate rápido foi concluída e poço perfurados na sede e em diversos distritos também.	Cumprida dentro do prazo	CAGECE

- **Projeto 2 - Realizar estudo sobre a infraestrutura dos sistemas alternativos (não operados pela CAGECE) no município de Ibicuitinga**

O Quadro 10 apresenta a ação proposta para este projeto, com a meta para 2016.

A Ação A1 está com a situação de “cumprida dentro do prazo”, haja vista que dos 19 poços existentes 6 estão em funcionamento.

Quadro 10 – Ação e Meta do Projeto 2.

Projeto 2		Meta/Prazo		2014	2015	2016	Situação	Fonte
A1	Realizar estudo e elaborar projeto executivo	M1	100% até 2016	Não iniciada.	19 poços perfurados na Sede e em diversas localidades em parceria com a SOHIDRA e DAS.	Dos 19 poços existentes, 6 estão em funcionamento (Canidezinho - 2, Viçosa - 1 e 3 nas comunidades Carrapicho, Grossos e Lagoa do Mato)	Cumprida dentro do prazo	Prefeitura Municipal

b) Drenagem Urbana

- **Projeto 3 – Elaboração do projeto do sistema de drenagem urbana.**

O Quadro 11 apresenta uma ação proposta para este projeto, com a meta para 2016.

A Ação A1 está com a situação de “cumprida dentro do prazo”, posto que existe 1 projeto executivo aguardando recurso.

Quadro 11 – Ação e Meta do Projeto 3.

Projeto 3		Meta/Prazo		2014	2015	2016	Situação	Fonte
A1	Elaborar projeto executivo	M1	100% até 2016	Não iniciada.	Não iniciada.	Existe 1 projeto executivo aguardando recurso.	Cumprida dentro do prazo	Prefeitura Municipal

c) Resíduos Sólidos

- **Projeto 4 – Adequação do transporte dos resíduos sólidos de Ibicuitinga**

O Quadro 12 apresenta uma ação proposta para este projeto, com a meta para 2016, 2024 e 2032.

A ação A1 encontra-se com a situação de “em andamento e dentro do prazo”, posto que foi contratada uma empresa para realizar a coleta com caminhão compactador.

Quadro 12 – Ação e Meta do Projeto 4.

Projeto 4		Meta/Prazo		2014	2015	2016	Situação	Fonte
A1	Adquirir 6 (seis) caminhões compactadores destinados ao transporte dos resíduos coletados	M1	33% até 2016; 33% até 2024; 33% até 2032	Empresa contratada para realizar coleta com caminhão compactador.	Empresa contratada para realizar coleta com caminhão compactador.	Empresa contratada para realizar coleta com caminhão compactador.	Em andamento e dentro do prazo	Prefeitura Municipal

- **Projeto 5 – Eliminação do lixão e recuperação da área degradada**

O Quadro 13 apresenta as duas ações propostas para este projeto, com a meta para 2016.

A Ação A1 está com a situação de “não cumprida”, tendo em vista que existe um projeto em execução com o CODEMA do Município. O Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos – Unidade Quixadá não logrou êxito.

A Ação A2 está com a situação de “não iniciada e dentro do prazo”, posto que está aguardando a consolidação do projeto junto ao CODEMA do Município.

Quadro 13 – Ações e Metas do Projeto 5.

Projeto 5		Meta/Prazo		2014	2015	2016	Situação	Fonte
A1	Elaboração do projeto executivo do aterro sanitário	M1	100% até 2014	Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Quixadá.	Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Quixadá.	Existe um projeto em execução com o CODEMA do Município. O Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Quixadá não logrou êxito.	Não cumprida.	Prefeitura Municipal
A2	Execução do aterro sanitário	M2	100% até 2016	Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Quixadá.	Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Quixadá.	Aguardando a consolidação do projeto junto ao CODEMA do Município.	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal

• **Projeto 6 – Unidade de triagem dos resíduos sólidos da coleta seletiva**

O Quadro 14 apresenta as três propostas para este projeto, com as respectivas metas para 2016, 2020 e 2032.

Projeto 6		Meta/Prazo		2014	2015	2016	Situação	Fonte
A1	Elaboração do projeto executivo do galpão modelo indicado pelo CONPAM	M1	100% até 2016	Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Quixadá.	Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Quixadá.	Aguardando a consolidação do projeto junto ao CODEMA do Município.	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A2	Adquirir equipamentos necessários ao funcionamento do galpão (prensa, balança, carrinho, plataforma e manual, empilhadeira simples)	M2	100% até 2016	Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Quixadá.	Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Quixadá.	Aguardando a consolidação do projeto junto ao CODEMA do Município.	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A3	Adquirir 3 (três) veículos pequenos para coleta seletiva	M3	33% até 2016; 66% até 2024; 100% até 2032	Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Quixadá.	Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Quixadá.	Aguardando a consolidação do projeto junto ao CODEMA do Município.	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal

A ação do Projeto 7 encontra-se na situação de “não iniciada e dentro do prazo”, posto que não foram relatadas informações sobre o cumprimento da meta estabelecida.

Quadro 15 – Ação e Meta do Projeto 7

Projeto 7		Meta/Prazo		2014	2015	2016	Situação	Fonte
A1	Construção da unidade de compostagem	M1	100% até 2016	Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Quixadá.	Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Quixadá.	Aguardando a consolidação do projeto junto ao CODEMA do Município.	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal

4.4. Programa Organizacional/Gerencial

- **Projeto 1 – Fortalecimento da Gestão dos Serviços**

O Quadro 16 apresenta as duas ações propostas para este projeto, com as respectivas metas para 2014 e 2016.

A Ação A1 está com a situação de “cumprida fora do prazo”, tendo em vista que permanece o cargo no quadro da Prefeitura.

A Ação A2 está com a situação de “cumprida dentro do prazo”, de acordo com a Prefeitura no ano de 2015 foram implantados a Secretaria de Agricultura e o Gabinete do Prefeito, já no ano de 2016 foi implantada a Secretaria de Obras e Infraestrutura.

Quadro 16 – Ações e Metas do Projeto 1.

Projeto 1		Meta/Prazo		2014	2015	2016	Situação	Fonte
A1	Levantar necessidades de capacitação de recursos humanos necessários para atuação nas atividades de gestão dos serviços.	M1	100% até 2014	-	Levantamento realizado e criado novo cargo no quadro da Prefeitura	Permanece o cargo no quadro da Prefeitura	Cumprida fora do prazo	Prefeitura Municipal
A2	Capacitar os recursos humanos	M2	100% até 2016	-	Secretaria de Agricultura e Gabinete do Prefeito.	Secretaria de Obras e Infraestrutura	Cumprida dentro do prazo	Prefeitura Municipal

- **Projeto 2 – Implantação de Sistema de Informações**

O Quadro 17 apresenta uma ação proposta para este projeto, com meta para 2014.

A Ação A1 encontra-se com a situação de “não cumprida”, embora a ARCE, em 2014, tenha enviado planilha eletrônica para fazer o acompanhamento da implementação do plano. Em relação ao ano de 2016 não foram relatadas informações pela Prefeitura, a respeito do cumprimento da meta.

Quadro 17 – Ação e Meta do Projeto 2.

Projeto 2		Meta/Prazo		2014	2015	2016	Situação	Fonte
A1	Implantar o sistema de informações no Município	M1	100% até 2014	Envio de planilha eletrônica provisória elaborada pela ARCE, para fazer o acompanhamento da implementação do plano.	Envio de planilha eletrônica provisória elaborada pela ARCE, para fazer o acompanhamento da implementação do plano.	Sem informação.	Não Cumprida	Prefeitura Municipal


5 . CONCLUSÕES

O Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Ibicuitinga possui 17 projetos, totalizando 31 ações que devem ser realizadas para melhorar a prestação dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana.

A reunião de acompanhamento do Plano possibilitou verificar em que nível está a execução dos projetos propostos, quantas metas já foram cumpridas, quantas estão em andamento, dentro dos prazos, e quantas a Prefeitura do Município já extrapolou a data estabelecida e não procedeu com nenhuma atividade.

O **Gráfico 1** e o **Quadro 18** apresentam um panorama do cumprimento das metas do plano. Verifica-se que, do total de ações propostas, 32,26% das metas foram cumpridas dentro dos prazos, 25,81% estão em andamento e dentro dos prazos, 6,45% foram cumpridas fora dos prazos, 29,03% não foram iniciadas mas estão dentro dos prazos e 6,45% não foram cumpridas.

Gráfico 1 – Cumprimento das metas do PMSB de Ibicuitinga

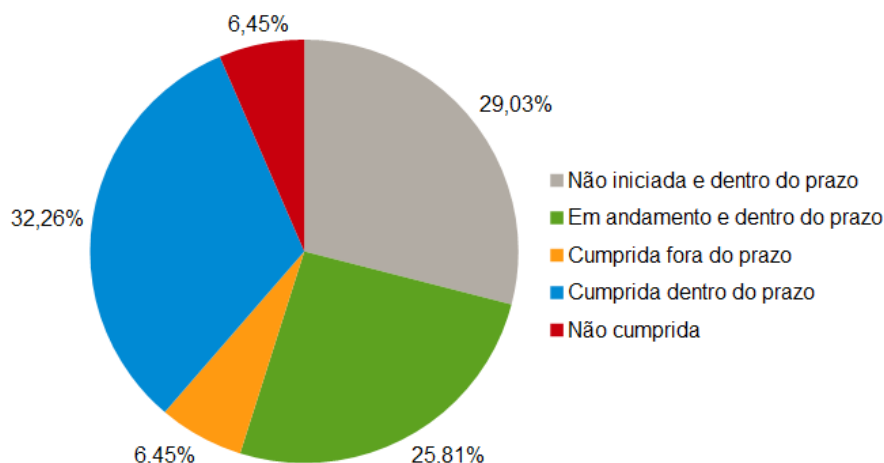

Quadro 18 – Situação Geral do Cumprimento do Projetos

Situação	PAS	PMOS	POG	TOTAL
Não iniciada e dentro do prazo	4	5	0	9
Em andamento e dentro do prazo	7	1	0	8
Cumprida fora do prazo	1	0	1	2
Cumprida dentro do prazo	6	3	1	10
Não cumprida	0	1	1	2

Verificou-se que está sendo feita a inserção a educação ambiental nas escolas da rede municipal, que devem ser continuadas de forma concomitante com a implementação do PMSB.

Ademais, é necessário iniciar o processo de revisão do contrato de concessão, adequando-o ao marco regulatório, em especial, ao PMSB.

O Município também providenciou o levantamento da necessidade de capacitação de recursos humanos e criação de órgãos na estrutura administrativa municipal. Tal fato, colabora com a gestão do Plano de Saneamento e com a execução do Programa Organizacional/Gerencial. Em relação a elaboração do Sistema de Informações não foram relatadas informações pela Prefeitura, a respeito do cumprimento da meta.

Por fim, conclui-se que é necessário haver maior interação da Prefeitura, com a CAGECE, SISAR e as demais entidades do setor de saneamento para melhor gestão do Saneamento Básico, no intuito de se alcançar a universalização.

6 . EQUIPE TÉCNICA

Coordenador CSB/ARCE:

- Engenheiro Geraldo Basílio Sobrinho

Analistas de Regulação CSB/ARCE:

- Engenheiro Alexandre Caetano da Silva
- Engenheiro Marcelo Silva de Almeida
- Engenheiro Márcio Gomes Rebello Ferreira

7 . APOIO TÉCNICO À ARCE

Tecg^a em Saneamento Ambiental – CSTA

- Luciana Barbosa

8 . RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Engenheiro Márcio Gomes Rebello Ferreira

Analista de Regulação

Matrícula: 108-1-2

Fortaleza – CE, 22 de Dezembro de 2016.
