

**RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA
RV/CSB/001/2016**

**Assunto: Acompanhamento do Plano Municipal de
Saneamento Básico do Município de Caridade**

COORDENADORIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**Fortaleza – CE
Dezembro/2016**

1 . FATO GERADOR

Considerando que o Município de Caridade já elaborou seu Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que a CAGECE (Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará) é a delegatária da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município;

Considerando o advento da Lei Federal nº 11.445/2007, que incumbiu o ente regulador e fiscalizador, dos serviços a verificação do cumprimento dos PMSBs, na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais (par. único, art. 20) e que o PMSB deve ser de responsabilidade do titular dos serviços e de cumprimento obrigatório pelo prestador de serviços no caso da delegação (art. 19, caput e §6º);

Considerando o Decreto Federal nº 7.217/2010, regulamentador da Lei nº 11.445/2007, de que o disposto no plano de saneamento básico é vinculado para o Poder Público que elaborou e para os delegatários dos serviços públicos de saneamento básico;

Considerando ainda que a Lei Estadual nº 14.394/2009, estabelece que compete à ARCE a regulação, a fiscalização e o monitoramento dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestados pela CAGECE (art. 4º).

A ARCE, realizou a ação de acompanhamento e verificação do cumprimento do PMSB do Município de Caridade, em 20/10/2016.

2 . OBJETIVO

O objetivo desta visita técnica foi detectar os níveis de execução do PMSB do Município de Caridade e orientar os responsáveis acerca dos principais problemas observados.

3 . HISTÓRICO

Esta é a primeira vez que a Coordenadoria de Saneamento Básico (CSB) da ARCE realiza ação de acompanhamento para verificação do cumprimento do PMSB de Caridade.

Essa atividade permitirá o acompanhamento de programas, projetos e ações para consecução dos objetivos e metas estabelecidas no PMSB, por meio do levantamento de dados dos projetos executados e dos que estavam em andamento, bem como daqueles que não haviam sido, ainda, iniciados, a fim de detectar os níveis de execução e orientar os responsáveis acerca dos principais problemas observados.

Para a realização desta primeira ação de acompanhamento, a Coordenadoria de Saneamento Básico da ARCE, no dia 27 de Setembro de 2016, enviou ofício OF/CSB/1240/2016 (Processo PCSB/CSB/0219/2016), informando sobre a realização das atividades de acompanhamento e verificação do cumprimento do PMSB do Município de Caridade, para encontro com representantes do poder Público Municipal e da CAGECE, na Sede da Prefeitura Municipal.

4 . DESCRIÇÕES DOS FATOS LEVANTADOS

A reunião para acompanhamento do PMSB foi realizada no dia 20 de outubro de 2016, às 09h, na Prefeitura Municipal de Caridade, com os seguintes participantes: Sr. Ari Paula Botelho (Assessor do Gabinete), Srta. Amanda Lopes Costa (Prefeita eleita do Município de Caridade) e Márcio Gomes (Analista da ARCE) (**Foto 1**). Esta reunião teve o objetivo de avaliar os níveis de execução do PMSB do Município de Caridade e orientar os responsáveis acerca dos principais problemas observados.



Foto 1 - Da esquerda para a direita: Sarah Bernardes (CSTA Serviços Ambientais), Amanda Lopes (Prefeita eleita de Caridade), Márcio Gomes (Analista da ARCE) e Ari Botelho (Assessor do gabinete).

4.1 Visita à Prefeitura

Atendendo à proposição do Ofício OF/CSB/1240/2016, os representantes da Prefeitura Municipal de Caridade e da CAGECE estiveram reunidos para informar à ARCE sobre o cumprimento do PMSB.

Os tópicos a seguir apresentam as metas e prazos dos programas, projetos e suas respectivas ações executadas rumo à universalização de cada componente do setor de saneamento básico.

4.2 Programa Acessibilidade ao Saneamento Básico

a) Abastecimento de Água

- **Projeto 1 - Ampliação do SAA operado pela CAGECE no distrito Sede.**

O Quadro 1 apresenta as três ações propostas para este projeto, com metas para 2013, 2016, 2020, 2024, 2028 e 2032.

Com relação as Ações A1 e A2, estas se encontram como “em andamento e dentro dos prazos”. Para a Ação A1, existe projeto de ampliação do SAA de Caridade, com recursos do PAC 2 / G3 Funasa, orçado em R\$ 4.178.180,79. Porém, o empreendimento encontra-se paralisado. Enquanto para a Ação A2, foram incrementadas 237 novas ligações, ou seja cerca de 16% da meta de curto prazo.

Com relação a Ação A3, esta se encontra como “não iniciada e dentro do prazo”, posto que não foram obtidas informações sobre o seu andamento.

Quadro 1 - Ações e Metas do Projeto 1

Projeto 1		Meta/Prazo	2016	Situação	Fonte	
A1	Elaborar 3 projetos executivos	M1	33% até 2013; 66% até 2016; 100% até 2024	Existe projeto de ampliação do SAA de Caridade, com recursos do PAC 2 / G3 Funasa, orçado em R\$ 4.178.180,79. O empreendimento encontra-se paralisado.	Em andamento e dentro do prazo	CAGECE
A2	Atender 1.504 novas ligações hidrometradas	M2	20% até 2016; 38% até 2020; 55% até 2024; 78% até 2028; 100% até 2032	Incremento de 237 ligações	Em andamento e dentro do prazo	CAGECE
A3	Realizar campanha de incentivo e disseminação do consumo e uso racional da água	M3	100% até 2016	Sem informação.	Não iniciada e dentro do prazo	CAGECE

- **Projeto 2 - Ampliação do SAA operado pela CAGECE na zona urbana do distrito Campos Belo.**

O Quadro 2 apresenta as três ações propostas para este projeto, metas para 2013, 2016, 2020, 2024, 2028 e 2032.

As Ações A1 e A2 estão na situação de “cumpridas dentro dos prazos”, haja vista a elaboração de projeto para o atendimento à Meta M2, na qual houve incremento de 2.011 ligações em 2016.

A Ação A3 está classificada como “não iniciada e dentro do prazo”, haja vista que não foram relatadas informações pela Prefeitura ou pela CAGECE para o seu atendimento.

Quadro 2 – Ações e Metas do Projeto 2

Projeto 2		Meta/Prazo	2016	Situação	Fonte	
A1	Elaborar 3 projetos executivos	M1	33% até 2013; 66% até 2016; 100% até 2024	Projeto elaborado para atendimento da meta M2.	Cumpridas dentro do prazo	CAGECE
A2	Atender 1.859 novas ligações hidrometradas	M2	0% até 2016; 34% até 2020; 69% até 2024; 84% até 2028; 100% até 2032	Incremento de 2.011 ligações	Cumpridas dentro do prazo	CAGECE
A3	Realizar campanha de incentivo e disseminação do consumo e uso racional da água	M3	100% até 2016	Sem informação.	Não iniciada e dentro do prazo	CAGECE

- **Projeto 3 - Ampliação do SAA na zona urbana do distrito São Domingos.**

O Quadro 3 apresenta as três ações propostas para este projeto, com metas para 2013 e 2016.

As Ações A1 a A3 estão classificadas como “cumpridas dentro dos prazos”, devido a implantação do SISAR, bem como, da ETA São Domingos e de campanhas na rádio local, conforme informa a Prefeitura.

Quadro 3 – Ações e Metas do Projeto 3.

Projeto 3		Meta/Prazo		2016	Situação	Fonte
A1	Elaborar 1 projetos executivos	M1	100% até 2013	Elaborado por ocasião da implantação do SISAR e da ETA	Cumpridas dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A2	Atender 115 novas ligações hidrometradas	M2	100% até 2016	Implantação do SISAR e da ETA São Domingos operada pela CAGECE.	Cumpridas dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A3	Realizar campanha de incentivo e disseminação do consumo e uso racional da água	M3	100% até 2016	Campanha na rádio local.	Cumpridas dentro do prazo	Prefeitura Municipal

- **Projeto 4 - Garantia da cobertura de abastecimento de água em localidades rurais do distrito Sede, Campos Belo e São Domingos onde já existem SAA.**

O Quadro 4 apresenta as três ações propostas para este projeto, com metas para 2013 e 2016.

As Ações A1 a A3 estão classificadas como “cumpridas dentro dos prazos”, em razão da implantação de dessalinizadores e de perfuração de poços na região, bem como, campanhas de incentivo ao consumo racional de água na rádio local.

Quadro 4 – Ações e Metas do Projeto 4.

Projeto 4		Meta/Prazo		2016	Situação	Fonte
A1	Elaborar projetos executivos para atendimento da meta de curto prazo	M1	100% até 2013	Projetos elaborados para perfuração de poços e construção de dessalinizadores.	Cumpridas dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A2	Atender 130 novas ligações hidrometradas em sistemas pertencentes ao Distrito Sede, Campos Belo e São Domingos	M2	100% até 2016	*Implantação de 5 dessalinizadores através do Programa Água Doce nas localidades de Pereiro, São João, Humaitá, São Vicente e Ipueira de Baixo; *Perfuração de 5 poços no Distrito Sede; *Perfuração de 5 poços no Distrito Campos Belo; *Perfuração de 6 poços no Distrito São Domingos;	Cumpridas dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A3	Realizar campanha de incentivo e disseminação do consumo e uso racional da água	M3	100% até 2016	Campanha na rádio local.	Cumpridas dentro do prazo	Prefeitura Municipal

- **Projeto 5 - Implantação de sistemas de abastecimento de água em localidades rurais do distrito Sede, Campos Belo e São Domingos onde não existem SAA.**

O Quadro 5 apresenta as duas ações propostas para este projeto, com metas para 2013 e 2016.

As Ações A1 e A2 estão classificadas como “cumpridas dentro dos prazos”, devido à implantação de dessalinizadores e de perfuração de poços na região, bem como, a elaboração de projetos para construção de redes de distribuição de água (RDA).

Quadro 5 – Ações e Metas do Projeto 5.

Projeto 5		Meta/Prazo		2016	Situação	Fonte
A1	Elaborar projetos executivos para atendimento das metas de curto e médio prazos	M1	100% até 2013	Projetos elaborados para construção de RDA através do Programa Água Para Todos nas localidades de Barra do Leão e Serrote do Distrito Sede.	Cumpridas dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A2	Atender 221 novas ligações hidrometradas nas zonas rurais do Distrito Sede e de Campos Belo.	M2	100% até 2016	Perfuração de 3 poços no Distrito Sede, nas localidades de Contendas, Lajes e Serrote; Perfuração de 2 poços no Distrito Campos Belo nas localidades de Pelada e Siriema.	Cumpridas dentro do prazo	Prefeitura Municipal

- **Projeto 6 - Implantação de solução individual de abastecimento de água para a população difusa dos distritos Sede, Campos Belo e São Domingos.**

O Quadro 6 apresenta duas ações propostas para este projeto, com metas para 2016 e 2020.

As Ações do Projeto 6 são classificadas como “não iniciadas e dentro dos prazos”, haja vista que não foram relatadas informações pela Prefeitura para o seu atendimento.

Quadro 6 – Ações e Metas do Projeto 6.

Projeto 6		Meta/Prazo		2016	Situação	Fonte
A1	Construir 1.057 cisternas (Sede: 579 ; Campos Belo: 453 e São Domingos: 25)	M1	52% até 2016; 100% até 2020	Aguardando informações.	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A2	Realizar treinamento para uso devido e manutenção das cisternas	M2	52% até 2016; 100% até 2020	Aguardando informações.	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal

b) Esgotamento Sanitário

- **Projeto 7 - Implantação e ampliação do SES no distrito Sede.**

O Quadro 7 apresenta as quatro ações propostas para este projeto, com as respectivas metas para 2016, 2020, 2024, 2028 e 2032.

Para as Ações A1 a A4, não foram relatadas informações a respeito do seu cumprimento, pela Prefeitura. Ademais suas situações são classificadas em “não iniciadas e dentro dos prazos”.

Quadro 7 – Ações e Metas do Projeto 7.

Projeto 7		Meta/Prazo		2016	Situação	Fonte
A1	Captar recursos para o projeto executivo do distrito Sede	M1	100% até 2016	Não iniciada	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A2	Implantar e ampliar o SES para atender 2.554 ligações	M2	39% até 2016; 79% até 2024; 100% até 2032	Não iniciada	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A3	Construir 638 fossas sépticas + sumidouro na zona urbana do Distrito Sede	M3	16% até 2016; 28% até 2020; 39% até 2024; 70% até 2028; 100% até 2032	Não iniciada	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A4	Realizar campanha de incentivo e disseminação da importância da destinação adequada dos esgotos	M4	100% até 2024	Não iniciada	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal

- **Projeto 8 - Implantação e ampliação do SES na zona urbana do distrito Campos Belo.**

O Quadro 8 apresenta as quatro ações propostas para este projeto, com as respectivas metas para 2016, 2020, 2024, 2028 e 2032.

Nas Ações A1 a A4, não foram encaminhadas informações a respeito do seu cumprimento, por parte da Prefeitura Municipal. Ademais, suas situações são classificadas como “não iniciadas e dentro dos prazos”.

Quadro 8 – Ações e Metas do Projeto 8.

Projeto 8		Meta/Prazo		2016	Situação	Fonte
A1	Elaborar projeto executivo para o distrito de Campos Belo	M1	100% até 2016	Não iniciada	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A2	Implantar e ampliar o SES para atender 2.195 ligações	M2	39% até 2016; 79% até 2024; 100% até 2032	Não iniciada	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A3	Construir 549 fossas sépticas + sumidouros em domicílios particulares da zona urbana do distrito Campos Belo	M3	16% até 2016; 28% até 2020; 39% até 2024; 70% até 2028; 100% até 2032	Não iniciada	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A4	Realizar campanha de incentivo e disseminação da importância da destinação adequada dos esgotos	M4	100% até 2024	Não iniciada	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal

- **Projeto 9 - Construção de FS + Sumidouro como solução individual para a população difusa na zona urbana e rural do município.**

O Quadro 9 apresenta as duas ações propostas para este projeto, com as respectivas metas para 2016, 2020 e 2024.

Nas Ações A1 e A2, não foram encaminhadas informações a respeito do seu cumprimento, por parte da Prefeitura Municipal. Ademais, suas situações são classificadas como “não iniciadas e dentro dos prazos”.

Quadro 9 – Ações e Metas do Projeto 9.

Projeto 9		Meta/Prazo		2016	Situação	Fonte
A1	Construir 2.870 fossas sépticas + sumidouros em domicílios particulares dos distritos - Sede: 1.074 (zona rural); Campos Belo: 615 (zona rural); São Domingos 490 (zona urbana) e 691 (zona rural)	M1	42% até 2016; 71% até 2020; 100% até 2024	Não iniciada	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A2	Realizar treinamento para uso devido e manutenção das fossas sépticas e sumidouros.	M2	100% até 2024	Não iniciada	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal

- **Projeto 10 - Construção de kits sanitários em domicílios particulares sem banheiro no município de Caridade.**

O Quadro 10 apresenta as três ações propostas para este projeto, com as respectivas metas para 2016 e 2020.

Nas Ações A1 a A3, não foram encaminhadas informações a respeito do seu cumprimento, por parte da Prefeitura Municipal. Ademais, suas situações são classificadas como “não iniciadas e dentro dos prazos”.

Quadro 10 – Ações e Metas do Projeto 10.

Projeto 10		Meta/Prazo		2016	Situação	Fonte
A1	Construir 126 kits sanitários em domicílios particulares da zona urbana do distrito Sede (30); Campos Belo (89) e São Domingos (7)	M1	100% até 2016	Não iniciada	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A2	Construir 450 kits sanitários em domicílios particulares da zona rural dos distritos Sede (246), Campos Belo (203) e São Domingos (1)	M2	43% até 2016; 100% até 2020	Não iniciada	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A3	Realizar treinamento para uso devido e manutenção das instalações sanitárias	M3	100% até 2020	Não iniciada	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal

c) Resíduos Sólidos

- **Projeto 11 - Ampliação da coleta de resíduos sólidos do Município de Caridade**

O Quadro 11 apresenta a ação A1 que tem como objeto a ampliação da cobertura da coleta em todo o município, com as respectivas metas para 2016, 2020 e 2024.

A Ação A1, encontra-se como “cumprida dentro do prazo”, haja vista a aquisição de 2 caminhões compactadores, o que, conforme a Prefeitura Municipal, atenderia a demanda de ampliação da cobertura.

Quadro 11 – Ação e Meta do Projeto 11.

Projeto 11		Meta/Prazo		2016	Situação	Fonte
A1	Ampliar a cobertura da coleta para atender 3.534 domicílios do distrito Sede (urbano 1.492 e rural 73); Campos Belo (urbano 1.605 e rural 2); São Domingos (urbano 344 e rural 18)	M1	42% até 2016; 71% até 2020; 100% até 2024	Cobertura ampliada com a aquisição de 2 caminhões compactadores	Cumpridas dentro do prazo	Prefeitura Municipal

4.3 Programa de Melhorias Operacionais e da Qualidade

a) Abastecimento de Água

- **Projeto 1 - Adequação do fornecimento de água distribuída pelo SAA da CAGECE do distrito Sede.**

O Quadro 12 apresenta as três ações propostas para este projeto, com as respectivas metas para 2013 e 2016.

Devido a falta de informações sobre o cumprimento das metas em atendimento, as Ações A1 e A3 se classificam como “não iniciadas e dentro dos prazos”, enquanto que, a Ação A2 encontra-se como “não cumprida”, devido ao vencimento de sua meta.

Quadro 12 – Ações e Metas do Projeto 1.

Projeto 1		Meta/Prazo		2016	Situação	Fonte
A1	Adequar o SAA com continuidade e pressões entre 10 e 50 m.c.a.	M1	100% até 2016	Sem informação.	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A2	Fornecer água tratada dentro dos padrões de potabilidade	M2	100% até 2013	Sem informação.	Não cumprida	Prefeitura Municipal
A3	Aumentar a capacidade de reservação atual.	M3	44% até 2016	Sem informação.	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal

- **Projeto 2 - Realizar estudo sobre a infraestrutura dos sistemas alternativos (não operados pela CAGECE) no município de Caridade.**

O Quadro 13 apresenta a ação proposta para este projeto, com meta para 2016.

A Ação A1 está com com a situação de “cumprida dentro do prazo”, devido a um estudo, existente no Projeto 4 – PAS Programa de Acessibilidade ao Saneamento Básico.

Quadro 13 – Ação e Meta do Projeto 2.

Projeto 2		Meta/Prazo		2016	Situação	Fonte
A1	Realizar estudo para avaliação dos sistemas das localidades dos distritos Sede, Campos Belo e São Domingos.	M1	100% até 2016	Estudo abrangido dentro do Projeto 4 - PAS	Cumpridas dentro do prazo	Prefeitura Municipal

b) Drenagem Urbana

- **Projeto 3 - Elaboração do projeto do sistema de drenagem urbana.**

O Quadro 14 apresenta a ação proposta para este projeto, com sua meta para 2016.

A Ação A1 se encontra na situação de “em andamento e dentro do prazo”, haja vista que não foi elaborado projeto executivo para o atendimento da sua meta.

Quadro 14 – Ação e Meta do Projeto 2.

Projeto 3		Meta/Prazo		2016	Situação	Fonte
A1	Elaborar projeto executivo	M1	100% até 2016	Em andamento	Em andamento e dentro do prazo	Prefeitura Municipal

c) Resíduos Sólidos

- **Projeto 4 - Adequação do transporte dos resíduos sólidos de Caridade.**

O Quadro 15 apresenta a ação proposta para este projeto, com as metas para 2016, 2024 e 2032.

Com relação a Ação A1, esta se encontra com a situação de “cumprida dentro do prazo”, posto que foram adquiridos 2 caminhões compactadores, desde a elaboração do PMSB.

Quadro 15 – Ação e Meta do Projeto 4.

Projeto 4		Meta/Prazo		2016	Situação	Fonte
A1	Adquirir 6 caminhões compactadores destinados ao transporte dos resíduos coletados.	M1	33% até 2016; 66% até 2024; 100% até 2032	A prefeitura adquiriu 2 caminhões compactadores.	Cumpridas dentro do prazo	Prefeitura Municipal

- **Projeto 5 - Eliminação do lixão e recuperação da área degradada.**

O Quadro 16 apresenta as duas ações propostas para este projeto, com as metas para 2014 e 2016.

A Ação A1 está com a situação de “não cumprida”, dado que seu prazo venceu em 2014 e o seu atendimento depende do Consórcio de Canindé.

A Ação A2 encontra-se na situação “não iniciada e dentro do prazo”, na medida em que aguarda a implantação do Consórcio de Canindé.

Quadro 16 – Ações e Metas do Projeto 5.

Projeto 5		Meta/Prazo		2016	Situação	Fonte
A1	Elaborar projeto e recuperar área degradada do lixão de Caridade.	M1	100% até 2014	Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Canindé.	Não cumprida	Prefeitura Municipal
A2	Dispor adequadamente os resíduos sólidos em aterro consorciado.	M2	100% até 2016	Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Canindé.	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal

- **Projeto 6 - Unidade de triagem dos resíduos sólidos da coleta seletiva.**

O Quadro 17 apresenta as três ações propostas para este projeto, com as metas para 2016, 2024 e 2032.

As Ações do projeto 6, encontram-se com a situação de “não iniciadas e dentro dos prazos”, observando que o seu atendimento está aguardando o início do Consórcio de Canindé.

Quadro 17 – Ações e Metas do Projeto 6.

Projeto 6		Meta/Prazo		2016	Situação	Fonte
A1	Construção da unidade de triagem modelo indicado pelo CONPAM	M1	100% até 2016	Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Canindé.	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A2	Adquirir equipamentos necessários ao funcionamento do galpão	M2	100% até 2016	Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Canindé.	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A3	Adquirir 3 veículos para coleta seletiva	M3	33% até 2016; 66% até 2024; 100% até 2032	Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Canindé.	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal

- **Projeto 7 - Unidade de compostagem de resíduos.**

O Quadro 18 apresenta a ação proposta para este projeto, com a meta para 2016.

O Projeto 7 está classificado com a situação de “não iniciado e dentro do prazo”, haja vista que assim como os Projetos 5 e 6, este também está aguardando o Consórcio de Canindé.

Quadro 18 – Ação e Meta do Projeto 7.

Projeto 7		Meta/Prazo		2016	Situação	Fonte
A1	Construção da unidade de compostagem.	M1	100% até 2016	Aguardando consolidação do Consórcio Intermunicipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Canindé.	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal

4.4 Programa Organizacional/Gerencial

- **Projeto 1 - Fortalecimento da Gestão dos Serviços**

O Quadro 19 apresenta as duas ações propostas para este projeto, com as respectivas metas que venceram em 2013 e 2014.

A Ação A1 está como “não cumprida”, pois a mesma venceu em 2013.

A Ação A2 está como “cumprida dentro do prazo”, segundo a Prefeitura Municipal, no entanto, não foi informado o número da Lei.

Quadro 19 – Ações e Metas do Projeto 1.

Projeto 1		Meta/Prazo		2016	Situação	Fonte
A1	Levantar necessidades de capacitação de recursos humanos necessários para atuação nas atividades de gestão dos serviços.	M1	100% até 2013	Não realizada.	Não cumprida	Prefeitura Municipal
A2	Criar órgão na estrutura administrativa municipal para a coordenação, articulação e integração da política de saneamento básico.	M2	100% até 2014	A Lei de criação do PMBS delegou à Secretaria Municipal de Saúde o acompanhamento e articulação das ações preconizadas no Plano.	Cumpridas dentro do prazo	Prefeitura Municipal

- **Projeto 2 - Implantação do Sistema de Informações**

O Quadro 20 apresenta uma ação proposta para este projeto, com vencimento em 2014.

Para a A1, foi enviada planilha eletrônica, no entanto, não foi implementado o sistema de informação.

Quadro 20 – Ação e Meta do Projeto 2.

Projeto 2		Meta/Prazo		2016	Situação	Fonte
A1	Implantar o sistema de informações	M1	100% até 2014	Envio de planilha eletrônica provisória elaborada pela ARCE, para fazer o acompanhamento da implementação do plano. Mas não desenvolveu o sistema	Não cumprida	Prefeitura Municipal

5 . CONCLUSÕES

O Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Caridade possui 20 projetos, totalizando 45 ações que devem ser realizadas para melhorar a prestação dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos.

A reunião de acompanhamento do Plano possibilitou verificar em que nível está a execução dos projetos propostos, quantas metas já foram cumpridas, quantas estão em andamento, dentro dos prazos, e quantas a Prefeitura do Município já extrapolou a data estabelecida e não procedeu com nenhuma atividade.


O **Gráfico 1** apresenta um panorama do cumprimento das metas do plano. Verifica-se que, do total de ações propostas, aproximadamente 8,89% não foram cumpridas, 31,11% das metas foram cumpridas dentro dos prazos, 6,67% estão em andamento e 53,33% não foram iniciadas mas estão dentro dos prazos.

Tanto no Projeto de Ampliação do SAA como no SES operados pela CAGECE no distrito Sede, tiveram em suas respectivas Ações A1, a elaboração de um projeto que atendessem suas respectivas Metas M2, haja vista a ampliação na quantidade de ligações hidrometradas e de esgoto, tais itens foram considerados como atendidos.

Concomitantemente à ampliação de SAA e a ampliação de SES, o município deveria realizar ações de educação ambiental em todos os níveis da rede municipal.

Ademais, é necessário iniciar o processo de revisão do contrato de concessão, adequando-o ao marco regulatório, em especial, ao PMSB.

Gráfico 1 – Cumprimento das metas do PMSB de Caridade.

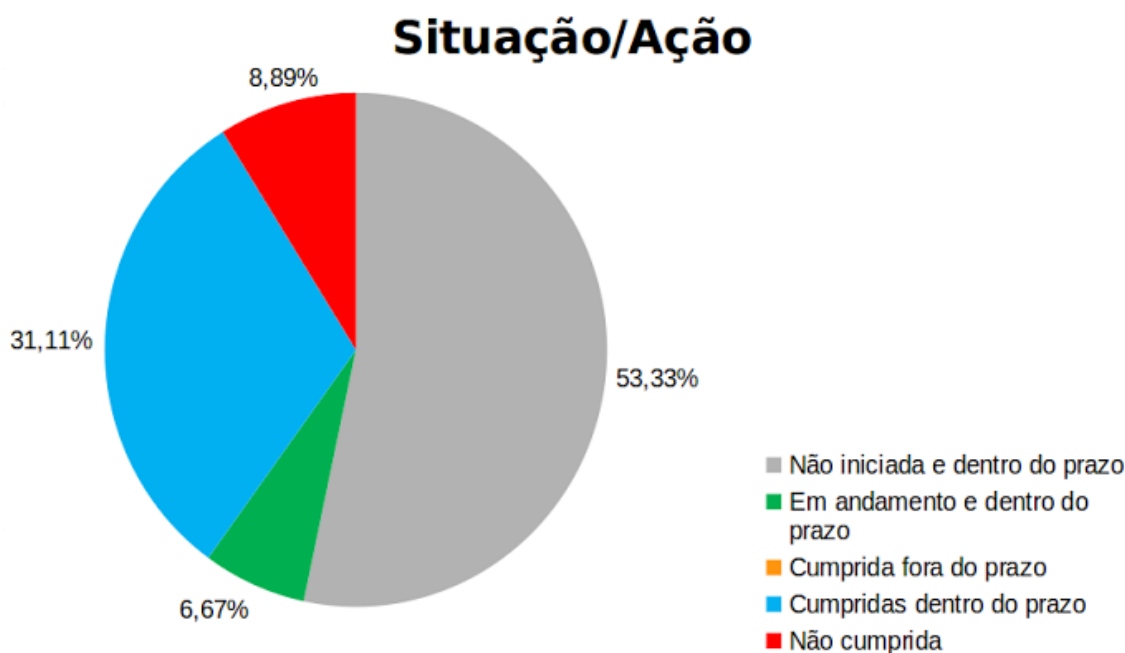

Quadro 21 – Situação Geral dos Programas

Situação/Ação	PAS	PMOS	POG	TOTAL
Não iniciada e dentro do prazo	17	7	0	24
Em andamento e dentro do prazo	2	1	0	3
Cumprida fora do prazo	0	0	0	0
Cumpridas dentro do prazo	11	2	1	14
Não cumprida	0	2	2	4

O Município também não providenciou o levantamento da necessidade de capacitação de recursos humanos e criação de órgão na estrutura administrativa municipal. Tal fato, não colabora com a gestão do Plano de Saneamento e com a execução do Programa Organizacional/Gerencial, que também inclui a elaboração de um Sistema de Informações.

Por fim, conclui-se que é necessário haver maior interação da Prefeitura, com a CAGECE, SISAR e as demais entidades do setor de saneamento em todas as suas etapas, ao longo de todo o período de cada ano e não somente durante o acompanhamento do PMSB pela ARCE para melhor gestão do Saneamento Básico, no intuito de se alcançar a universalização.

6 . EQUIPE TÉCNICA

Coordenador CSB/ARCE:

- Engenheiro Geraldo Basílio Sobrinho

Analistas de Regulação CSB/ARCE:

- Engenheiro Alexandre Caetano da Silva
- Engenheiro Marcelo Silva de Almeida
- Engenheiro Márcio Gomes Rebello Ferreira

7 . APOIO TÉCNICO À ARCE

Tecg^a em Saneamento Ambiental – CSTA

- Sarah de Oliveira Bernardes

8 . RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Engenheiro Márcio Gomes Rebello Ferreira

Analista de Regulação

Matrícula: 108-1-2

Fortaleza – CE, 22 de Dezembro de 2016.
