



RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA RV/CSB/012/2016

**Assunto: Acompanhamento do Plano Municipal de
Saneamento Básico do Município de Saboeiro**

COORDENADORIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**Fortaleza – CE
Dezembro/2016**

1 . FATO GERADOR

Considerando que o Município de Saboeiro já elaborou seu Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que a CAGECE (Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará) é a delegatária da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município;

Considerando o advento da Lei Federal nº 11.445/2007, que incumbiu o ente regulador e fiscalizador, dos serviços a verificação do cumprimento dos PMSBs, na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais (par. único, art. 20) e que o PMSB deve ser de responsabilidade do titular dos serviços e de cumprimento obrigatório pelo prestador de serviços no caso da delegação (art. 19, caput e §6º);

Considerando o Decreto Federal nº 7.217/2010, regulamentador da Lei nº 11.445/2007, de que o disposto no plano de saneamento básico é vinculado para o Poder Público que elaborou e para os delegatários dos serviços públicos de saneamento básico.

Considerando que a Lei Estadual nº 14.394/2009 estabeleceu a competência da ARCE para exercer a regulação, a fiscalização e o monitoramento dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestados pela CAGECE (art. 4º).

Considerando, ainda, a Lei Complementar nº 162/2016 que instituiu a Política de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado do Ceará.

A ARCE realizou a ação de acompanhamento e verificação do cumprimento do PMSB do Município de Saboeiro, cujas atividades incluiu uma reunião com gestores municipais realizada em 10/11/2016.

2 . OBJETIVO

Verificar o andamento dos programas, projetos e ações para alcance dos seus objetivos e metas estabelecidos no PMSB do Município de Saboeiro.

3 . HISTÓRICO

Esta é a terceira vez que a Coordenadoria de Saneamento Básico (CSB) da ARCE realiza ação de acompanhamento para verificação do cumprimento do PMSB de Saboeiro, com visita ao município e reunião com gestores públicos. De fato, as ações anteriores ocorreram em 03/12/2014¹ e 04/11/2015², respectivamente.

Essas atividades permitiram o acompanhamento de programas, projetos e ações para consecução de seus objetivos e metas estabelecidas no PMSB, por meio do levantamento de dados dos projetos executados e dos que estavam em andamento, bem como daqueles que não haviam sido, ainda, iniciados, a fim de detectar os níveis de execução e orientar os responsáveis acerca dos principais problemas observados.

Para a realização desta terceira ação de acompanhamento, a Coordenadoria de Saneamento Básico da ARCE, no dia 07 de outubro de 2016, enviou ofício OF/CSB/1310/2016 (Processo PCSB/CSB/0219/2016), informando sobre a realização das atividades de acompanhamento e verificação do cumprimento do PMSB do Município de Saboeiro, para encontro com representantes do poder Público Municipal e da CAGECE, na Sede da Prefeitura Municipal.

4 . DESCRIÇÕES DOS FATOS LEVANTADOS

A reunião para acompanhamento do PMSB foi realizada no dia 10 de novembro de 2016, às 14h, na Prefeitura Municipal de Saboeiro, com os seguintes participantes: Sr. Francisco Magalhães Diógenes Júnior (Gestor de Núcleo da CAGECE de Saboeiro), o Sr. Márcio Gomes (Analista da ARCE) e a Sra. Alyne Pinheiro Lima (Supervisora de água) e Sra. Lucineide Coqueiro Gurgel (Téc. em Operação e Manutenção). Esta reunião teve o objetivo de detectar os níveis de execução do PMSB do Município de Saboeiro e orientar os responsáveis acerca dos principais problemas observados (**Foto 1**).

¹ 23/10/2014 e 10/11/2015, <http://www.arce.ce.gov.br/index.php/relatorios-de-fiscalizacao-saneamento/acompanhamento-de-pmsb/category/332-verificacao-do-cumprimento-do-pmsb?download=6119%3Arfcsb00662014-acompanhamento-de-pmsb>

² Disponível em <http://www.arce.ce.gov.br/index.php/relatorios-de-fiscalizacao-saneamento/acompanhamento-de-pmsb/category/332-verificacao-do-cumprimento-do-pmsb?download=7564%3Arfcsb00662015-anexado-em-25012016>



Foto 1 - Da esquerda para a direita: Sra. Alyne Pinheiro Lima (Supervisora de água), Sra. Lucineide Coqueiro Gurgel (Téc. Em operação e Manutenção), Sr. Francisco Magalhães Diógenes Júnior (Gestor de Núcleo da CAGECE de Saboeiro) e Márcio Gomes (Analista da ARCE).

4.1 Visita à Prefeitura

Os tópicos a seguir apresentam as metas e prazos dos programas, projetos e suas respectivas ações executadas rumo à universalização de cada componente do setor de saneamento básico.

4.2 Programa Acessibilidade ao Saneamento Básico

a) Abastecimento de Água

- **Projeto 1 - Ampliação do SAA operado pela CAGECE no distrito Sede**

O Quadro 1 apresenta as três ações e metas propostas para este projeto, bem como, sua evolução no cumprimento de suas metas.

A Ação A1 está com a situação de “em andamento e dentro do prazo”, haja vista a elaboração de projeto para o atendimento à Meta M2.

A Ação A2 encontra-se com situação de “cumprida dentro do prazo”, tendo em vista o incremento de 262 ligações em 2016.

A ação A3 permanece na situação de “não iniciada e dentro do prazo”, segundo informado neste ano não foi realizada campanha da importância do consumo e uso racional de água tratada.

Quadro 1 – Ações e Metas do Projeto 1

Projeto 1		Meta/Prazo	2014	2015	2016	Situação	Fonte
A1	Elaborar 3 projetos executivos para atendimento das metas estabelecidas de curto, médio e longo prazos	M1 33% até 2013; 66% até 2016; 100% até 2024	-	Há 1 (um) projeto de 2001 com horizonte de planejamento até 2021. Precisa ser readequado ao PMSB.	O projeto elaborou para atendimento da meta M2. Existe um projeto de ampliação de rede sendo executado em parceria com a Prefeitura.	Em andamento e dentro do prazo	CAGECE
A2	Ampliar a cobertura para atender 1.179 novas ligações hidrometradas	M2 18% até 2016; 37% até 2020; 56% até 2024; 78% até 2028; 100% até 2032	Não informada a quantidade de ligações. A CAGECE responsabilizou-se por atualizar o cadastro e repassar à Prefeitura.	22% 256 ligações.	Incremento de 262 ligações.	Cumprida dentro do prazo	CAGECE
A3	Realizar campanha de incentivo e disseminação da importância do consumo e uso racional de água tratada	M3 100% até 2016	-	A Cagece, esteve no município de Saboeiro para realizar campanha de conscientização sobre o uso racional da água, através de divulgação porta-aporta e apresentação de teatro de bonecos nas escolas.	Segundo informado esse ano não foi realizada campanha da importância do consumo e uso racional de água tratada	Não iniciada e dentro prazo	CAGECE

- **Projeto 2 - Ampliação dos SAA's nas zonas urbanas dos distritos Barrinha, Felipe, Flamengo, Malhada e São José**

O Quadro 2 apresenta as três ações propostas para este projeto, com as respectivas metas para 2013 e 2016.

A Ação A1 encontra-se com situação de “cumprida dentro do prazo”, posto que o projeto já está sendo executado.

A Ação A2 está com a situação de “em andamento e dentro do prazo”, tendo em vista que foi concluído o sistema do distrito Barrinha e na localidade de Aroeira (Flamengo). Permanece em processo de incorporação ao sistema do SISAR a localidade de Cachoeira do Sifronio (Flamengo). Ademais, houve a escavação de poços nos distritos: Felipe (2), São José (2), Flamengo (2) e Sede (6). Porém, apenas 4 poços dos distritos (com chafariz) permanecem com água.

Para a Ação A3 considera-se sua situação como “não iniciada e dentro do prazo”, considerando que não houve informações sobre o seu cumprimento.

Quadro 2 – Ações e Metas do Projeto 2.

Projeto 2		Meta/Prazo	2014	2015	2016	Situação	Fonte	
A1	Elaborar projeto executivo para atendimento da meta estabelecidas de curto prazo	M1	100% até 2013	-	-	O projeto já está sendo executado.	Cumprida dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A2	Ampliar a cobertura para atender 313 novas ligações hidrometradas Barrinha: 39 lig Felipe: 41 lig Flamengo: 124 lig Malhada: 34 lig São José: 75	M2	100% até 2016	Não informada a quantidade de ligações. Distritos beneficiados com o Projeto Água para Todos. A prefeitura responsabilizou-se por realizar o levantamento de dados.	Não informada a quantidade de ligações. Projeto transferido para o SISAR. A prefeitura responsabilizou-se por realizar o levantamento de dados.	Foi concluído o sistema do distrito Barrinha e na localidade de aroeira (Flamengo). Permanece em processo de incorporação ao sistema do SISAR a localidade de Cachoeira do Sifronio (Flamengo). Ademais, houve a escavação de poços nos distritos: Felipe (2), São José (2), Flamengo (2) e Sede (6). Porém, apenas 4 poços dos distritos (com chafariz) permanece com água.	Em andamento e dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A3	Realizar campanha de incentivo e disseminação da importância do consumo e uso racional de água tratada	M3	100% até 2016	-	-	Sem informações	Não iniciada e dentro do prazo	Prefeitura Municipal

- **Projeto 3 - Implantação de solução individual de abastecimento de água para a população difusa dos distritos Sede, Barrinha, Felipe, Flamengo, Malhada e São José**

O Quadro 3 apresenta as duas ações propostas para este projeto, com as respectivas metas para 2016 e 2020.

A Ação A1 encontra-se com situação de “cumprida dentro do prazo”, posto que a meta foi concluída em 2014 com a construção de 1.800 cisternas, após esse período não houve nenhuma construção.

Com relação a Ação A2, sua situação também está “em andamento e dentro do prazo”, haja vista que houve treinamento na entrega das cisternas.

Quadro 3 – Ações e Metas do Projeto 3.

Projeto 3		Meta/Prazo	2014	2015	2016	Situação	Fonte	
A1	Construir 2.605 cisternas: Sede: 1.156 cis Barrinha: 161 cis Felipe: 80 cis Flamengo: 414 cis Malhada: 393 cis São José: 401 cis	M1	50% até 2016; 100% até 2020	69% 1.800 cisternas	593 cisternas cadastradas no SIG Cisterna do MDS.	A meta foi concluída em 2014 com a construção de 1.800 cisterna, após esse período não houve nenhuma construção.	Cumprida dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A2	Realizar treinamento para uso devido e manutenção das cisternas	M2	50% até 2016; 100% até 2020	69%	-	houve treinamento na entrega das cisternas.	Cumprida dentro do prazo	Prefeitura Municipal

b) Esgotamento Sanitário

• **Projeto 4 - Implantação e ampliação do SES no distrito Sede**

O Quadro 4 apresenta as quatro ações e metas propostas para este projeto, bem como, sua evolução no cumprimento de suas metas.

A Ação A1 encontra-se com situação de “não iniciada e dentro do prazo”, considerando que não houve informações sobre o seu cumprimento.

Com relação a Ação A2 situa-se como “em andamento e dentro do prazo”, tendo em vista o incremento de 10 novas ligações.

A Ação A3 encontra-se com situação de “não iniciada e dentro do prazo”. Em 2014 havia um projeto licitado e contratado pela FUNASA, porém ainda não foi executado.

A Ação A4 encontra-se com situação de “não iniciada e dentro do prazo”, haja vista que segundo informado neste ano não foi realizada, pois os domicílios que possuem a rede de água já são contemplados com a coleta de esgoto. Portanto é necessário que ocorra a ampliação da rede coletora.

Quadro 4 – Ações e Metas do Projeto 4.

Projeto 4		Meta/Prazo	2014	2015	2016	Situação	Fonte
A1	Elaborar 3 projetos executivos para atendimento das metas estabelecidas de curto, médio e longo prazo de ampliação da cobertura	M1 33% até 2013; 66% até 2016; 100% até 2024	Não informado	Há 1 (um) projeto de 2002 com implantação do SES. Precisa ser readequado ao PMSB (até 2032).	Sem informações	Não iniciada e dentro prazo	CAGECE
A2	Ampliar a cobertura para atender 2.750 novas ligações	M2 46% até 2016; 85% até 2024; 100% até 2032	Não informado	2 lig 1%.	Incremento de 10 ligações.	Em andamento e dentro do prazo	CAGECE
A3	Construir 708 fossas sépticas + sumidouros no distrito Sede	M3 18% até 2016; 30% até 2020; 43% até 2024; 71% até 2028; 100% até 2032	Há 1 (um) projeto licitado e contratado pela FUNASA.	Não informado	Não Construído.	Não iniciada e dentro prazo	Prefeitura Municipal
A4	Realizar campanha de incentivo e disseminação da importância da destinação adequada dos esgotos	M4 100% até 2024	-	A Cagece - Geris esteve no município de Saboeiro para realizar campanha de conscientização sobre a importância da utilização da rede de esgoto, através de divulgação porta-a-porta e apresentação de teatro de bonecos nas escolas.	Segundo informado esse ano não foi realizada, pois os domicílios que possui a rede de água já é contemplado com a coleta de esgoto. Portanto é necessário que ocorra a ampliação da rede coletora	Não iniciada e dentro prazo	CAGECE

• **Projeto 5 - Construção de FS + Sumidouro como solução individual para a população difusa na zona urbana e rural do município**

O Quadro 5 apresenta as duas ações propostas para este projeto, com as metas para 2016 e 2020.

A Ação A1 encontra-se com situação de “não iniciada e dentro do prazo”, apesar de, em 2015, a prefeitura ter se responsabilizado por buscar informações e realizar um levantamento, o mesmo ainda não foi executado.

A Ação A2 encontra-se com situação de “não iniciada e dentro do prazo”, considerando que não houve informações sobre o seu cumprimento.

Quadro 5 – Ações e Metas do Projeto 5.

Projeto 5		Meta/Prazo	2014	2015	2016	Situação	Fonte
A1	Construir 2.776 fossas sépticas + sumidouros nos distritos Sede (zona rural: 410); Barrinha (Zona urbana: 207 e zona rural: 95; Felipe (zona urbana: 161 e zona rural: 111); Flamengo (zona urbana: 512 e zona rural: 284); Malhada (zona urbana: 145 e zona rural: 281) e São José (zona urbana: 289 e zona rural: 281)	M1 50% até 2016; 100% até 2020	Não Construído.	Não Construído. A prefeitura responsabilizou-se por buscar informações e realizar um levantamento.	Não Construído.	Não iniciada e dentro prazo	Prefeitura Municipal
A2	Realizar treinamento para uso devido e manutenção das fossas sépticas e sumidouros.	M2 50% até 2016; 100% até 2020	-	-	-	Não iniciada e dentro prazo	Prefeitura Municipal

- **Projeto 6 - Construção de kits sanitários em domicílios particulares sem banheiro no município de Saboeiro**

O Quadro 6 apresenta as três ações propostas para este projeto, com as metas para 2016 e 2020.

A Ação A1 está com a situação de “cumprida dentro do prazo”, haja vista que foram construídos 38 kits sanitários.

A Ação A2 encontra-se na situação de “não iniciada e dentro do prazo”. Em 2015, a prefeitura responsabilizou-se por buscar informações e realizar o levantamento, mas ainda não foi executado.

A Ação A3 também encontra-se na situação de “não iniciada e dentro do prazo”, considerando que não houve informações sobre o seu cumprimento.

Quadro 6 – Ações e Metas do Projeto 6.

Projeto 6		Meta/Prazo	2014	2015	2016	Situação	Fonte
A1	Construir 138 kit sanitários em domicílios particulares da zona urbana dos distritos Sede (97 Barrinha (5), Felipe (4), Flamengo (26), Malhada (3) e São José (3)	M1 50% até 2016; 100% até 2020	50% (70 kits)	Não Construído. A prefeitura responsabilizou-se por buscar informações e realizar o levantamento.	Foi construído 38 kits na Sede	Cumprida dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A2	Construir 1.247 kit sanitários em domicílios particulares da zona rural dos distritos Sede (609), Barrinha (104), Felipe (55), Flamengo (210), Malhada (104) e São José (165)	M2 50% até 2016; 100% até 2020	Não Construído.	Não Construído. A prefeitura responsabilizou-se por buscar informações e realizar o levantamento.	Não Construído.	Não iniciada e dentro prazo	Prefeitura Municipal
A3	Realizar treinamento informativo para uso devido e manutenção das instalações sanitárias	M3 50% até 2016; 100% até 2020	-	-	-	Não iniciada e dentro prazo	Prefeitura Municipal

c) Resíduos Sólidos

- **Projeto 7 - Ampliação da coleta dos resíduos sólidos de Saboeiro**

O Quadro 7 apresenta a ação proposta para este projeto, bem como, sua evolução no cumprimento de suas metas.

A Ação A1 está com sua situação de “cumprida dentro do prazo”, posto que a coleta foi universalizada no Município, segundo informado pela Prefeitura.

Quadro 7 – Ação e Meta do Projeto 7.

Projeto 7		Meta/Prazo	2014	2015	2016	Situação	Fonte
A1	Ampliar a cobertura da coleta para atender 1.945 domicílios (Sede - 1.192; Barrinha - 109; Felipe - 119; Flamengo - 266; Malhada - 93; São José - 166)	M1 39% até 2016; 53% até 2020; 67% até 2024; 84% até 2028; 100% até 2030	39%	Não informada a quantidade de domicílios. A prefeitura responsabilizou-se por buscar informações e realizar o levantamento.	A coleta foi universalizada no Município.	Cumprida dentro do prazo	Prefeitura Municipal

4.3 Programa de Melhorias Operacionais e da Qualidade

a) Abastecimento de Água

- **Projeto 1 - Adequar o fornecimento da água distribuída pelo SAA da CAGECE do distrito Sede**

O Quadro 8 apresenta a ação proposta para este projeto, com meta para 2016.

A Ação A1 encontra-se na situação de “em andamento e dentro do prazo”. Em 2014, relatou-se que ocorriam problemas de baixa pressão e descontinuidade no município. Em 2015, segundo o representante da CAGECE, está sendo realizada a ampliação da rede de distribuição de água para Vila Nocrata, com instalação de uma estação elevatória de água, para reforçar o abastecimento até um ponto específico do sistema, de onde é possível abastecer por gravidade. Atualmente, a estação elevatória na Vila Nocrata foi instalada. No entanto, está aguardando a ampliação de rede.

Quadro 8 – Ação e Meta do Projeto 1.

Projeto 1		Meta/Prazo		2014	2015	2016	Situação	Fonte
A1	Solucionar o problema de baixa pressão e descontinuidade	M1	100% até 2016	Problemas de pressão e continuidade.	Está sendo realizada a ampliação da rede de distribuição de água para a Vila Nocrata com instalação de uma estação elevatória de água, que visa promover o reforço do abastecimento ao ponto onde é possível abastecer através do sistema existente (por gravidade).	A elevatória na Vila Nocrata foi instalado. No entanto, está aguardando a ampliação de rede.	Em andamento e dentro do prazo	CAGECE

- **Projeto 2 - Realizar estudo sobre a infraestrutura dos sistemas alternativos (não operados pela CAGECE) no município de Saboeiro**

O Quadro 9 apresenta a ação proposta para este projeto, com meta para 2016.

A Ação A1 encontra-se na situação de “não iniciada e dentro do prazo”. Posto que não houve a incorporação do sistema do Distrito de Felipe pelo SISAR.

Quadro 9 – Ação e Meta do Projeto 2.

Projeto 2		Meta/Prazo		2014	2015	2016	Situação	Fonte
A1	Realizar estudo e elaborar projeto executivo	M1	100% até 2016	Necessidade de transferir os sistemas existentes para o SISAR.	Incorporação do sistema do Distrito de Felipe pelo SISAR.	Não houve a incorporação do sistema do Distrito de Felipe pelo SISAR.	Não iniciada e dentro prazo	Prefeitura Municipal

b) Drenagem Urbana

- **Projeto 3 - Elaboração do projeto do sistema de drenagem urbana.**

O Quadro 10 apresenta a ação proposta para este projeto, com a meta para 2016.

A Ação A1 permanece na situação de “não iniciada e dentro do prazo”, haja vista que está sendo aguardado um estudo feito pela FUNASA.

Quadro 10 – Ação e Meta do Projeto 3.

Projeto 3		Meta/Prazo		2014	2015	2016	Situação	Fonte
A1	Elaborar projeto executivo	M1	100% até 2016	Nenhum estudo foi realizado.	Nenhum estudo foi realizado.	Aguardando um estudo feito pela FUNASA.	Não iniciada e dentro prazo	Prefeitura Municipal

c) Resíduos Sólidos

- **Projeto 4 - Adequação do transporte dos resíduos sólidos de Saboeiro**

O Quadro 11 apresenta a ação proposta para este projeto, com a meta para 2016, 2024 e 2032.

Com relação a Ação A1, esta se encontra com a seguinte situação de “cumprida dentro do prazo”. Em 2014, a Prefeitura informou que realizou uma experiência com um caminhão compactador e que este mostrou-se inadequado, em função do seu porte, da topografia e das ruas estreitas do Município. Em 2015, a coleta é realizada com um caminhão caçamba. Atualmente, a coleta é feita por 2 (dois) caminhões caçamba no distrito Sede.

Quadro 11 – Ação e Meta do Projeto 4.

Projeto 4		Meta/Prazo	2014	2015	2016	Situação	Fonte
A1	Adquirir 3 (três) caminhões compactadores destinados ao transporte dos resíduos coletados	M1 33% até 2016; 66% até 2024; 100% até 2032	A Prefeitura informou que houve experiência com caminhão compactador, porém mostrou-se inadequado.	A coleta permanecerá com caminhão caçamba, este projeto perdeu o efeito e deve ser revisado.	A coleta é feita por 2 (dois) caminhões caçamba no distrito Sede.	Cumprida dentro do prazo	Prefeitura Municipal

- Projeto 5 - Eliminação do lixão e recuperação da área degradada**

O Quadro 12 apresenta as duas ações propostas para este projeto, com a meta para 2016.

A Ação A1 permanece ainda com a situação de “não cumprida”, na medida em que aguarda a 2ª fase do Consórcio de Assaré.

A Ação A2 encontra-se na situação “em andamento e dentro do prazo”, dado que também aguarda a 2ª fase do Consórcio de Assaré.

Quadro 12 – Ações e Metas do Projeto 5.

Projeto 5		Meta/Prazo	2014	2015	2016	Situação	Fonte
A1	Elaborar projeto e recuperar área degradada do lixão de Saboeiro	M1 100% até 2014	Aguardando o Consórcio de Assaré.	O Consórcio de Assaré já se encontra na 2ª fase.	Aguardando a 2ª fase do Consórcio de Assaré.	Não cumprida.	Prefeitura Municipal
A2	Dispor adequadamente os resíduos sólidos em aterro consorciado	M2 100% até 2016	Aguardando o Consórcio de Assaré.	Aguardando a conclusão do Consórcio de Assaré.	Aguardando a 2ª fase do Consórcio de Assaré.	Em andamento e dentro do prazo	Prefeitura Municipal

- Projeto 6 - Unidade de triagem dos resíduos da coleta seletiva**

O Quadro 13 apresenta as três ações propostas para este projeto, com a meta para 2014, 2016, 2024 e 2032.

A Ação A1 encontra-se na situação de “não cumprida”, na medida em que aguarda a 2ª fase do Consórcio de Assaré. O Município informou que possui um galpão de triagem para a "Associação De Colaboradores e Recicladores de Saboeiro" que realiza a reciclagem de garrafas PET na confecção de vassouras.

A Ação A2 encontra-se na situação de “em andamento e dentro do prazo”, posto que o galpão existente possui os equipamentos necessários na confecção de vassouras recicladas.

A Ação A3 também encontra-se na situação de “em andamento e dentro do prazo”, na medida em que aguarda a 2ª fase do Consórcio de Assaré.

Quadro 13 – Ações e Metas do Projeto 6.

Projeto 6		Meta/Prazo		2014	2015	2016	Situação	Fonte
A1	Construir unidade de triagem, modelo indicado pelo CONPAM	M1	100% até 2014	Aguardando o Consórcio de Assaré. Em paralelo, a prefeitura em parceria com a Coelce implantou o Ecoelce.	A sociedade entre a prefeitura e a Coelce não prosperou.	Aguardando a 2ª fase do Consórcio de Assaré. O Município possui um galpão de triagem para a "Associação De Colaboradores e Recicladores de Saboeiro" que realiza a reciclagem de garrafas PET na confecção de vassouras.	Não cumprida.	Prefeitura Municipal
A2	Adquirir equipamentos necessários ao funcionamento do galpão (prensa, balança, carrinho, plataforma e manual, empilhadeira simples)	M2	100% até 2016	-	-	O galpão existente possui os equipamentos necessários na confecção de vassouras recicladas.	Em andamento e dentro do prazo	Prefeitura Municipal
A3	Adquirir 3 (três) veículos para coleta seletiva	M3	33% até 2016; 66% até 2024; 100% até 2032	-	-	Aguardando a 2ª fase do Consórcio de Assaré.	Em andamento e dentro do prazo	Prefeitura Municipal

- **Projeto 7 - Unidade de compostagem dos resíduos**

O Quadro 14 apresenta a ação proposta para este projeto, com a meta para 2016.

A Ação A1 encontra-se na situação de “em andamento e dentro do prazo”, posto que aguarda a 2ª fase do Consórcio de Assaré.

Quadro 14 – Ação e Meta do Projeto 7.

Projeto 7		Meta/Prazo		2014	2015	2016	Situação	Fonte
A1	Construção da unidade de compostagem	M1	100% até 2016	Não iniciada.	O Consórcio de Assaré já se encontra na 2ª fase.	Aguardando a 2ª fase do Consórcio de Assaré.	Em andamento e dentro do prazo	Prefeitura Municipal

4.4 Programa Organizacional/Gerencial

- **Projeto 1 - Fortalecimento da Gestão dos Serviços**

O Quadro 15 apresenta as duas ações propostas para este projeto, com as metas que venceram em 2013 e 2014.

A Ação A1 encontra-se na situação de “cumprida fora do prazo”, posto que existe 1 (um) representante da Secretaria de Saúde responsável pelo acompanhamento do PMSB.

A Ação A2 também encontra-se na situação de “cumprida fora do prazo”, tendo em vista que os órgãos responsáveis permanecem com a Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde.

Quadro 15 – Ações e Metas do Projeto 1.

Projeto 1		Meta/Prazo	2014	2015	2016	Situação	Fonte
A1	Levantar necessidades de capacitação de recursos humanos necessários para atuação nas atividades de gestão dos serviços.	M1 100% até 2013	Não iniciada.	Não iniciada.	Existe 1 (um) representante da Secretaria de Saúde responsável pelo acompanhamento do PMSB.	Cumprida fora do prazo	Prefeitura Municipal
A2	Criar órgão na estrutura administrativa municipal para a coordenação, articulação e integração da política do saneamento básico	M2 100% até 2014	Não Criado.	Aprovação da Lei nº 68/2012 que definiu a Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde como órgãos responsáveis pelo acompanhamento do PMSB.	Os órgãos responsáveis permanece com a Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde.	Cumprida fora do prazo	Prefeitura Municipal

- **Projeto 2 - Implantação do Sistema de Informações**

O Quadro 16 apresenta a ação proposta para este projeto, com a meta que venceu em 2014.

A ação A1 encontra-se com a situação de “não cumprida”. Em 2014 a ARCE responsabilizou-se por elaborar e enviar uma planilha eletrônica provisória para auxiliar o município a realizar o acompanhamento da implementação do plano. Em 2015 a planilha foi novamente enviada. Atualmente foi constatado que a planilha elaborada pela ARCE, para fazer o acompanhamento da implementação do plano não foi preenchida. Os representantes da prefeitura se comprometeram em enviar a planilha preenchida.

Quadro 16 – Ação e Meta do Projeto 2.

Projeto 2		Meta/Prazo	2014	2015	2016	Situação	Fonte
A1	Implantar o sistema de informações	M1 100% até 2014	Envio de planilha eletrônica provisória, elaborado pela ARCE, para fazer o acompanhamento da implementação do plano.	Envio novamente de planilha eletrônica provisória, elaborado pela ARCE, para fazer o acompanhamento da implementação do plano. Os representantes da prefeitura se comprometeram em enviar a planilha preenchida.	A planilha elaborado pela ARCE, para fazer o acompanhamento da implementação do plano não foi preenchida. Os representantes da prefeitura se comprometeram em enviar a planilha preenchida.	Não cumprida.	Prefeitura Municipal

5 . CONCLUSÕES

O Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Saboeiro possui 16 projetos, totalizando 31 ações que devem ser realizadas para melhorar a prestação dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana.


A reunião de acompanhamento do Plano possibilitou verificar em que nível está a execução dos projetos propostos, quantas metas já foram cumpridas, quantas estão em andamento, dentro do prazo, e quantas a Prefeitura do Município já extrapolou a data estabelecida e não procedeu com nenhuma atividade.

O município, em parceria com os prestadores de serviços, deve realizar ações de educação ambiental. Ademais, é necessário iniciar o processo de revisão do contrato de concessão, adequando-o ao marco regulatório, em especial, ao PMSB.

O Município apesar de indicar um responsável pelo saneamento, tal fato, não colabora com a gestão do Plano de Saneamento. Torna-se imprescindível a execução do Programa Organizacional/Gerencial para estruturar o município para essa tarefa, cujos projetos inclui a implantação de um Sistema de Informações.

O **Gráfico 1** apresenta um panorama do cumprimento das metas do plano. Verifica-se que, do total de ações propostas, 22,58% das metas foram cumpridas dentro dos prazos, 25,81% estão em andamento e dentro dos prazos, 6,45% foram cumpridas fora dos prazos, 35,48% não foram iniciadas mas então dentro dos prazos e 9,68% não foram cumpridas.

Gráfico 1 – Cumprimento das metas do PMSB de Saboeiro.

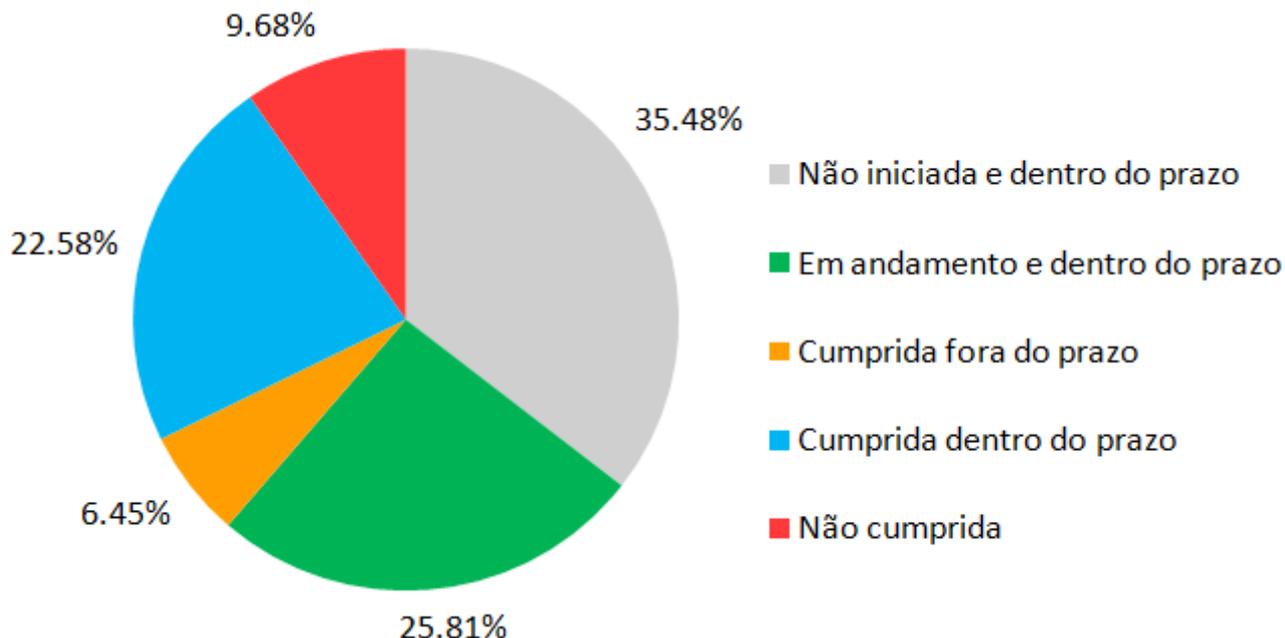

Quadro 17 – Situação dos Projetos.

Situação	PAS	PMOS	POG	TOTAL
Não iniciada e dentro do prazo	9	2	0	11
Em andamento e dentro do prazo	3	5	0	8
Cumprida fora do prazo	0	0	2	2
Cumprida dentro do prazo	6	1	0	7
Não cumprida	0	2	1	3

Por fim, conclui-se que é necessário haver maior interação da Prefeitura, com a CAGECE, SISAR e as demais entidades do setor de saneamento, no intuito de se alcançar a universalização.

6 . EQUIPE TÉCNICA

Coordenador CSB/ARCE:

- Engenheiro Geraldo Basílio Sobrinho

Analistas de Regulação CSB/ARCE:

- Engenheiro Alexandre Caetano da Silva
- Engenheiro Marcelo Silva de Almeida
- Engenheiro Márcio Gomes Rebello Ferreira

7 . APOIO TÉCNICO À ARCE

Tecg^a em Saneamento Ambiental – CSTA

- Camila Cassundé Sampaio

8 . RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Engenheiro Márcio Gomes Rebello Ferreira

Analista de Regulação

Matrícula: 108-1-2

Fortaleza – CE, 22 de Dezembro de 2016.
