



AGÊNCIA  
REGULADORA  
DO ESTADO  
DO CEARÁ

**RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA  
RV/CSB/0007/2017**

**Assunto: Acompanhamento do Plano Municipal de  
Saneamento Básico do Município de Santa Quitéria**

**COORDENADORIA DE SANEAMENTO BÁSICO**

Fortaleza – CE

Agosto/2017

## **1 . FATO GERADOR**

Considerando que o Município de Santa Quitéria já elaborou seu Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que a CAGECE (Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará) é a delegatária da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município.

Considerando o advento da Lei Federal nº 11.445/2007, que incumbiu o ente regulador e fiscalizador, dos serviços a verificação do cumprimento dos PMSBs, na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais (par. único, art. 20) e que o PMSB deve ser de responsabilidade do titular dos serviços e de cumprimento obrigatório pelo prestador de serviços no caso da delegação (art. 19, caput e §6º).

Considerando o Decreto Federal nº 7.217/2010, regulamentador da Lei nº 11.445/2007, de que o disposto no plano de saneamento básico é vinculado para o Poder Público que elaborou e para os delegatários dos serviços públicos de saneamento básico.

Considerando que a Lei Estadual nº 14.394/2009 estabeleceu a ARCE como a responsável pela regulação, fiscalização e monitoramento dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestados pela CAGECE (art. 4º).

Considerando, ainda, a Lei Complementar nº 162/2016 que instituiu a Política de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado do Ceará.

A ARCE, realizou a ação de acompanhamento e verificação do cumprimento do PMSB do Município de Santa Quitéria, em 07/06/2017.

## **2 . OBJETIVO**

O objetivo desta visita técnica foi verificar o andamento dos programas, projetos e ações para alcance dos objetivos e metas estabelecidas no PMSB do Município de Santa Quitéria e avaliar a capacidade de gestão municipal do setor de saneamento básico.

## **3 . HISTÓRICO**

Esta é a primeira vez que a Coordenadoria de Saneamento Básico (CSB) da ARCE realiza ação de acompanhamento para verificação do cumprimento do PMSB de Santa Quitéria. Para tanto, a Coordenadoria de Saneamento Básico da ARCE, no dia 11 de Maio de 2017, enviou ofício OF/CSB/002/2017 (Processo PCSB/CSB/091/2017), propondo a realização desta primeira ação de acompanhamento e verificação do

[Centro Adm. Gov. Virgílio Távora – Av. Gen. Afonso Albuquerque Lima, S/N - Cambéba](#)  
[CEP 60.822-325 • Fortaleza/CE • Tel \(85\) 3194.5605/5606 – \[arce@arce.ce.gov.br\]\(mailto:arce@arce.ce.gov.br\)](#)

cumprimento do PMSB do Município de Santa Quitéria e respectivos programas, projetos e ações para consecução dos objetivos e metas do plano, com a participação de representantes do poder Público Municipal e da CAGECE, na Sede da Prefeitura Municipal.

Dentre as atividades previstas, foi realizado um encontro com representantes do poder Público Municipal e da CAGECE, no dia 07 de junho de 2017, às 10h, na Prefeitura Municipal de Santa Quitéria, com os seguintes participantes: João Batista de Souza Júnior (Secretário de Obras), Antonio Arildo de Oliveira Teles (Gestor de Núcleo), Francisca Zélia Sousa Silva (Auxiliar de Engenharia UNBAC), Timóteo Magalhães Rodrigues (Fiscal de Obras), Marcelo Almeida (Analista da ARCE) e Camila Cassundé (CSTA). Esta reunião teve o objetivo de avaliar os níveis de execução do PMSB do Município de Santa Quitéria e orientar os responsáveis acerca dos principais problemas observados (**Foto 1**).



**Foto 1** - Reunião de acompanhamento do PMSB.

## **4 . DESCRIÇÕES DOS FATOS LEVANTADOS**

Os tópicos a seguir apresentam as metas e prazos dos programas, projetos e suas respectivas ações executados rumo à universalização de cada componente do setor de saneamento básico.

### **4.1 Programa Acessibilidade ao Saneamento Básico**

#### **a) Abastecimento de Água**

• **Projeto 1 - Ampliação do SAA operado pela CAGECE no distrito Sede**

O **Quadro 1** apresenta as quatro ações propostas para este projeto, com metas para 2019, 2027 e 2035. As ações A1 a A4, estas classificadas como “em andamento”.

Para a ação A1, ainda não foi elaborado o projeto executivo, pois o sistema existente atende a demanda não havendo a necessidade de sua ampliação. Enquanto para a ação A2, foram incrementadas 214 novas ligações, ou seja cerca de 4,60% da meta de curto prazo. Já a ação A3, não houve melhorias na captação e nem ampliação nas unidades do sistema, haja visto que o sistema existente atende a demanda, como foi informado acima. Com relação a ação A4, a Cagece informou que realiza campanha sobre a importância da interligação do imóvel à rede pública de abastecimento por meio das contas dos usuários.

**Quadro 1 - Ações e Metas do Projeto 1.**

Projeto 1		Meta /Prazo		2017	Situação	Fonte
A1	Elaborar <u>1</u> projeto executivo	M1	100% até 2019	Não há projeto executivo. O sistema existente atende a demanda, não há necessidade de ampliação. Rever meta.	Em andamento	CAGECE
A2	Ampliar a cobertura para atender <u>4.645</u> novas ligações hidrometradas	M2	47,36% até 2019; 71,67% até 2027; 100% até 2035	214 novas ligações na Sede - 4,60%	Em andamento	CAGECE
A3	Melhorar a captação e ampliar as unidades do sistema	M3	100% até 2027	No momento, não há necessidade de realizar melhorias na captação e ampliar as unidades do sistema.	Em andamento	CAGECE
A4	Realizar campanhas de incentivo e disseminação da importância da interligação do imóvel à rede pública de abastecimento de água.	M4	Contínua	A CAGECE apresenta informativo nas contas, principalmente na época de estiagem.	Em andamento	CAGECE

• **Projeto 2 - Ampliação do SAA operado pela CAGECE na zona urbana do distrito Lisieux**

O **Quadro 2** apresenta as quatro ações propostas para este projeto, metas para 2019, 2027 e 2035.

As ações A1 a A4, estão classificadas como “em andamento”. Para a ação A1, ainda não foi elaborado projeto executivo, pois o sistema existente atende a demanda não havendo a necessidade de sua ampliação. Enquanto para a ação A2, foram incrementadas 56 novas ligações, ou seja cerca de 1,86% da meta de curto prazo. Sobre a ação A3, apesar de haver captação superficial e subterrânea, ela está sendo feita apenas por poços, mas a prefeitura solicitou que volte a ser feita superficial, pois existe um problema com a qualidade da água dos poços. Com relação a ação A4, a Cagece

informou que realiza campanha sobre a importância da interligação do imóvel à rede pública de abastecimento, por meio das contas dos usuários.

**Quadro 2 – Ações e Metas do Projeto 2.**

Projeto 2		Meta/Prazo		2017	Situação	Fonte
A1	Elaborar <u>1</u> projeto executivo	M1	100% até 2019	Não há necessidade de ampliação do sistema.	Em andamento	CAGECE
A2	Ampliar a cobertura para atender <u>3.003</u> novas ligações hidrometradas	M2	63,38% até 2019; 80,28% até 2027; 100% até 2035	56 novas ligações - 1,86%	Em andamento	CAGECE
A3	Melhorar a captação e ampliar as unidades do sistema	A3	100% até 2019	Há captação superficial e subterrânea. Existe um problema com a qualidade da água dos poços, pois é salobra. Hoje, utilizam-se somente os poços e a prefeitura solicita que volte para a captação superficial.	Em andamento	CAGECE/Prefeitura
A4	Realizar campanhas de incentivo e disseminação da importância do consumo e uso racional de água tratada	M4	Contínua	A CAGECE traz informativo nas contas, principalmente na época de estiagem.	Em andamento	CAGECE

• **Projeto 3 - Ampliação do SAA na zona urbana do distrito Maracará**

O **Quadro 3** apresenta as quatro ações propostas para este projeto, com metas para 2019, 2027 e 2035.

As ações A1 a A4 estão classificadas como “em andamento”. Para a ação A1, ainda não foi elaborado projeto executivo, pois o sistema existente atende a demanda não havendo a necessidade de ampliação. Enquanto para a ação A2, foram incrementadas 10 novas ligações, ou seja cerca de 10,52% da meta de curto prazo. A ação A3, não houve melhorias na captação e nem ampliação nas demais unidades, haja visto que o sistema existente atende a demanda, como dito acima. Com relação a ação A4, a Cagece informou que realiza campanha sobre a importância da interligação do imóvel à rede pública de abastecimento por meio das contas dos usuários.

**Quadro 3 – Ações e Metas do Projeto 3.**

Projeto 3		Meta/Prazo		2017	Situação	Fonte
A1	Elaborar <u>1</u> projeto executivo	M1	100% até 2019	Não há necessidade. Rever meta.	Em andamento	CAGECE
A2	Ampliar a cobertura para atender <u>95</u> novas ligações hidrometradas no SAA de Maracará	M2	24,21% até 2019; 61,05% até 2027; 100% até 2035	10 ligações - 10,52%	Em andamento	CAGECE
A3	Melhorar a captação e ampliar as unidades do sistema	M3	100% até 2027	Não há necessidade de melhorias na captação e ampliação do sistema.	Em andamento	CAGECE
A4	Realizar campanhas de incentivo e disseminação da importância do consumo e uso racional de água tratada	M4	Contínua	A CAGECE traz informativo nas contas, principalmente na época de estiagem.	Em andamento	CAGECE

• **Projeto 4 - Ampliação do SAAs implantados pelo SISAR nos distritos de Muribeca, Raimundo Martins, Sede e Trapiá**

O **Quadro 4** apresenta as quatro ações propostas para este projeto, com metas para 2019, 2027 e 2035.

As ações A1 a A4 estão classificadas como “em andamento”. A respeito das ações A1, A3 e A4 não foram relatadas informações pela Prefeitura para o seu atendimento. Enquanto para ação A2 a Prefeitura informou que existe uma adutora na localidade de Trapiá, mas que o SISAR não assume o sistema sem que antes a Prefeitura realize as melhorias necessárias no mesmo, contudo a Prefeitura alega não ter recursos para tais serviços.

**Quadro 4 – Ações e Metas do Projeto 4.**

Projeto 4		Meta/Prazo	2017	Situação	Fonte	
A1	Elaborar 6 projetos executivos	M1	100% até 2019	Sem informação.	Em andamento	Prefeitura
A2	Ampliar a cobertura para atender 778 novas ligações hidrometradas nas localidades de Assentamento Saco do Belém/Sede, Palestina, Raimundo Martins, Vila São Damião, Vila Sem, Paulo Pessoa, Sangradouro	M2	80,91% até 2019; 89,85% até 2027; 100% até 2035	Existe adutora na Localidade de Trapiá e a manutenção é realizada pela Prefeitura. O SISAR não assume o sistema como está e exige que a Prefeitura faça as melhorias para depois assumir. A Prefeitura não possui recursos para realizar as melhorias necessárias no sistema.	Em andamento	Prefeitura
A3	Melhorar a captação e ampliar as unidades dos sistemas	M3	100% até 2027	Sem informação.	Em andamento	Prefeitura
A4	Realizar campanhas de incentivo e disseminação da importância do consumo e uso racional de água tratada	M4	Contínua	Sem informação.	Em andamento	Prefeitura

• **Projeto 5 - Projeto de implantação de SAAs, onde não existe sistema coletivo de abastecimento, nas localidades dos distritos de Lisieux, Logradouro, Muribeca e Trapiá**

O **Quadro 5** apresenta as três ações propostas para este projeto, com metas para 2019, 2027 e 2035.

As ações A1 a A3 estão classificadas como “em andamento”. Para as ações A1 e A3 não foram relatadas informações pela Prefeitura para o seu atendimento. A respeito da ação A2 que trata da ampliação dos 11 sistemas solicitados, foi concluído o de São Damião e estão em fase de conclusão as adutoras de: Salão (Sede), Morgado (Trapiá), Jatobá (Trapiá), Pau Branco e Maniçoba (Trapiá).

**Quadro 5 – Ações e Metas do Projeto 5.**

Projeto 5		Meta/Prazo		2017	Situação	Fonte
A1	Elaborar <b>22</b> projetos executivos	M1	100% até 2019	Sem informação.	Em andamento	Prefeitura
A2	Implantar 22 sistemas para atender as localidades de Assentamento Groaíras/Furado (Lisieux), Assentamento Batoque, Assentamento Mirador, Assentamento Pintada, Assentamento Valparaíso (Logradouro), Assentamento Barra do Juá, Assentamento Cacimba Nova, Assentamento Juá/ Belo Horizonte, Assentamento Juá/ Gangorra, Assentamento Juá/ Mata Fresca, Assentamento Juá/ São Damião, Assentamento Saco dos Bois, Assentamento Três Marias, Assentamento Várzea de Cima I, PA S. Belém / Boa Vista I, PA S. Belém / Boa Vista II, PA S. Belém / Porcinhos, Santa Margarida (Muribeca), Assentamento Riacho Novo, Fazenda Aprasível, Fazenda Lagoa Grande, Fazenda Pindoba (Trapιά)	M2	97,40% até 2027; 100% até 2035	Foram solicitados 11 sistemas, mas realizado apenas em São Damião. Está em conclusão a adutora Salão (Sede), Morgado (Trapιά) e Jatobá (Trapιά). Pau Branco, Maniçoba (Trapιά).	Em andamento	Prefeitura
A3	Realizar campanhas de incentivo e disseminação da importância do consumo e uso racional de água tratada	M3	Contínua	Sem informação.	Em andamento	Prefeitura

### b) Esgotamento Sanitário

- **Projeto 6 - Implantação e ampliação do SES no distrito Sede**

O **Quadro 6** apresenta as cinco ações propostas para este projeto, com as respectivas metas para 2019, 2027 e 2035.

As ações A1 a A5 estão classificadas como “em andamento”. Para a ação A1 não foi relatada informações a respeito do seu cumprimento, pela Prefeitura. A respeito da ação A2 a Prefeitura informou que não existe esgotamento sanitário na cidade e o projeto existente está desatualizado, mas que está em processo de cotação com as empresas para a licitação de um novo projeto. As ações A3 e A5 não iniciaram pois dependem da elaboração do projeto. Já a ação A4 que diz respeito a construção dos kits sanitários também não iniciou.

### Quadro 6 – Ações e Metas do Projeto 6.

Projeto 6		Meta/Prazo		2017	Situação	Fonte
A1	Realizar estudo de viabilidade para assunção do sistema	M1	100% até 2019	Sem informação.	Em andamento	Prefeitura
A2	Elaborar <b>1</b> projeto executivo	M2	100% até 2019	Não há esgotamento sanitário. O Secretário de Obras informou que existia um projeto e que em sua atualização, as ruas não correspondiam com as de Santa Quitéria. Está em processo de cotação com empresas, para licitar um novo projeto.	Em andamento	Prefeitura
A3	Ampliar a cobertura para atender <b>10.308</b> novas ligações	M3	100% até 2027	Depende da Ação A2.	Em andamento	Prefeitura
A4	Construir <b>3.353</b> kits sanitários em domicílios particulares do distrito Sede	M4	41,56% até 2019; 100% até 2035	Não construído.	Em andamento	Prefeitura
A5	Realizar programa de incentivo e disseminação da importância da interligação dos esgotos à rede pública	M5	Contínua	Depende da Ação A2.	Em andamento	Prefeitura

#### • Projeto 7 - Implantação e ampliação do SES no distrito de Lisieux

O **Quadro 7** apresenta as cinco ações propostas para este projeto, com as respectivas metas para 2019 e 2027.

As ações A1 a A5 estão classificadas como “em andamento”. As ações A1 e A2 conforme informação da Prefeitura não foram iniciadas. A respeito da ação A3 que trata da ampliação da rede com novas ligações, ainda não foi iniciada, pois depende da Meta M2. Quanto as ações A4 e A5, também não foram iniciadas, pois elas dependem da elaboração do projeto e da ampliação da cobertura da rede com novas ligações.

### Quadro 7 – Ações e Metas do Projeto 7.

Projeto 7		Meta/Prazo		2017	Situação	Fonte
A1	Realizar estudo de viabilidade para assunção do sistema	M1	100% até 2019	Não realizado.	Em andamento	Prefeitura
A2	Elaborar <b>1</b> projeto executivo	M2	100% até 2019	Não elaborado.	Em andamento	Prefeitura
A3	Ampliar a cobertura para atender <b>1.208</b> novas ligações	M3	100% até 2027	Depende da Ação A2.	Em andamento	Prefeitura
A4	Construir <b>302</b> kits sanitários em domicílios particulares do distrito Lisieux	M4	57,52% até 2019; 100% até 2027	Não construído.	Em andamento	Prefeitura
A5	Realizar programa de incentivo e disseminação da importância da interligação dos esgotos à rede pública	M5	Contínua	Depende da Ação A3.	Em andamento	Prefeitura

#### • Projeto 8 - Implantação e ampliação do SES no distrito de Macaraú

O **Quadro 8** apresenta as cinco ações propostas para este projeto, com as respectivas metas para 2019 e 2027.



As ações A1 a A5 estão classificadas como “em andamento”. A respeito das ações A1, A2 e A3 a Prefeitura informou que elas não iniciaram. Já a ação A3 não foi iniciada, pois depende da elaboração do projeto (meta da ação A2) o qual não foi concluído, assim como a ação A5 depende da ação A3.

**Quadro 8 – Ações e Metas do Projeto 8.**

Projeto 8		Meta/Prazo		2017	Situação	Fonte
A1	Realizar estudo de viabilidade para assunção do sistema	M1	100% até 2019	Não realizado.	Em andamento	Prefeitura
A2	Elaborar <u>1</u> projeto executivo	M2	100% até 2019	Não elaborado.	Em andamento	Prefeitura
A3	Ampliar a cobertura para atender <u>814</u> novas ligações	M3	100% até 2027	Depende da Ação A2.	Em andamento	Prefeitura
A4	Construir <u>83</u> kits sanitários em domicílios particulares do distrito Panacuí	M4	57,52% até 2019; 100% até 2027	Não construído.	Em andamento	Prefeitura
A5	Realizar programa de incentivo e disseminação da importância da interligação dos esgotos à rede pública	M5	Contínua	Depende da Ação A3.	Em andamento	Prefeitura

• **Projeto 9 - Construção de kits sanitários em domicílios particulares sem banheiro no município de Santa Quitéria**

O **Quadro 9** apresenta as quatro ações propostas para este projeto, com as respectivas metas para 2019, 2027 e 2035.

Nas ações A1 e A2, a Prefeitura informou que não iniciou as construções das fossas sépticas e dos módulos sanitários. Já as ações A3 e A4, também não foram iniciadas, pois dependem das ações A1 e A2. Ademais, suas situações são classificadas como “em andamento”.

**Quadro 9 – Ações e Metas do Projeto 9.**

Projeto 9		Meta/Prazo		2017	Situação	Fonte
A1	Construir fossas sépticas em domicílios particulares dos distritos de Logradouro ( <b>390</b> ), Malhada Grande ( <b>185</b> ), Muribeca ( <b>650</b> ), Raimundo Martins ( <b>190</b> ) e Trapiá ( <b>319</b> )	M1	100% até 2019	Não construído.	Em andamento	Prefeitura
A2	Construir <b>2.256</b> módulos sanitários em domicílios particulares dos distritos de Logradouro ( <b>100</b> ), Malhada Grande ( <b>174</b> ), Muribeca ( <b>278</b> ), Raimundo Martins ( <b>930</b> ) e Trapiá ( <b>774</b> )	M2	55,51% até 2019; 97,17% até 2027; 100% até 2035	Não construído.	Em andamento	Prefeitura
A3	Realizar treinamento para uso devido e manutenção dos módulos sanitários	M3	Contínua	Depende da Ação A2.	Em andamento	Prefeitura
A4	Realizar campanhas de incentivo e disseminação da importância da destinação adequada de esgotos	M4	Contínua	Depende da Ação A1 e A2.	Em andamento	Prefeitura

## 4.2 Programa de Melhorias Operacionais e da Qualidade

### a) Abastecimento de Água

#### • Projeto 1 - Adequação do fornecimento de água tratada nos SAAs operados pela CAGECE no distrito Sede, Lisieux e Macaraú

O **Quadro 10** apresenta as cinco ações propostas para este projeto, com as respectivas metas para 2027.

As ações A1 a A5, estão com a situação “em andamento”. Sobre a ação A1 a Cagece informou que não ocorrem problemas de pressão e continuidade na Sede e em Macaraú, já na localidade de Lisieux não houve informações. Quanto as ações A2 e A3 a Cagece informou que a oferta de água atende a demanda da sede e localidades, não sendo necessário aumento na reservação atual. Nas ações A4 e A5, com o intuito de reduzir os índices de perdas de água distribuída, a Cagece tem uma equipe de retirada de vazamentos e outra de combate as fraudes no sistema.

**Quadro 10 – Ações e Metas do Projeto 1.**

Projeto 1		Meta/Prazo	2017	Situação	Fonte	
A1	Adequar os SAAs com continuidade e pressões entre 10 e 50 m.c.a.	M1	100% até 2027	Não ocorre problemas de pressão e continuidade na Sede e em Macaraú. Para Lisieux, não há informação.	Em andamento	CAGECE
A2	Adequar as produções de água tratada às demandas destes distritos.	M2	100% até 2027	A produção atende a demanda.	Em andamento	CAGECE
A3	Adequar as capacidades de reservação atuais	M3	100% até 2027	Não há necessidade de adequar a capacidade atual.	Em andamento	CAGECE
A4	Reduzir os índices de perdas de águas distribuídas.	M4	Contínua	Ocorrem vazamentos esporádicos e a equipe da CAGECE vai ao local pra retirar.	Em andamento	CAGECE
A5	Combater as fraudes nos sistemas	M5	Contínua	Realizado pela equipe de fraudes.	Em andamento	CAGECE

#### • Projeto 2 - Adequar o fornecimento da água distribuída pelo SISAR nos distritos de Muribeca, Raimundo Martins, Sede e Trapiá

O **Quadro 11** apresenta as ações propostas para este projeto, com meta para 2027.

As ações A1 e A2 estão com com a situação “em andamento”. Para essas ações, não foram relatadas informações a respeito do seu cumprimento, pela Prefeitura.

**Quadro 11 – Ação e Meta do Projeto 2.**

Projeto 2		Meta/Prazo		E	Situação	Fonte
A1	Adequar a produção de água tratada	M1	100% até 2027	Sem informação.	Em andamento	Prefeitura
A2	Adequar a capacidade de reservação atual	M2	100% até 2027	Sem informação.	Em andamento	Prefeitura

- **Projeto 3 - Realizar o estudo sobre a infraestrutura dos sistemas alternativos (não operados pela CAGECE) nas localidades dos distritos de Lisieux - Assentamento Groaíras/Sede, Assentamento Raposa, Picos de Cima, Logradouro - Logradouro, Vila São Cosme, Fazenda Boa Sorte, Fazenda Maniçoba, Malhada Grande - Areal, Malhada Grande, Picos de Baixo, Muribeca - Assentamento Grossos, Assentamento Juá/ Sede, Assentamento Nova Brasília, São José dos Mocós, Raimundo Martins - Assentamento Quixaba, Sede - Cabeceiras, Sabiá, São Damião dos Cassimiros, Trapiá – Trapiá**

O **Quadro 12** apresenta a ação proposta para este projeto, com sua meta para 2019.

A ação A1 encontra-se na situação “em andamento”. A Prefeitura informou que já foi solicitado um projeto para melhorias, mas não houve retorno e foi aberto um edital para um sistema simplificado de abastecimento de água junto ao Governo do Estado.

**Quadro 12 – Ação e Meta do Projeto 2.**

Projeto 3		Meta/Prazo		2017	Situação	Fonte
A1	Realizar estudo para avaliação dos SAAs existentes nas localidades	M1	100% até 2019	Já foi solicitado projeto para melhorias, mas não houve retorno. Foi aberto edital para sistema simplificado de abastecimento de água junto ao Governo do Estado.	Em andamento	Prefeitura

### **4.3 Programa Organizacional/Gerencial**

- **Projeto 1 - Projeto para fortalecer a gestão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário**

O **Quadro 13** apresenta as três ações propostas para este projeto, com as respectivas metas para 2019 e 2027.

As ações A1 a A3 estão classificadas como “em andamento”. A ação A1 não foi iniciada, conforme informado pela Prefeitura. Quanto a ação A2, sobre instituir a Política Nacional de Saneamento Básico, a Lei ainda não foi sancionada. Já quanto a ação A3

que trata de elaborar o Plano Diretor de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, a Prefeitura informou que está sendo revisto.

**Quadro 13 – Ações e Metas do Projeto 1.**

Projeto 1		Meta/Prazo		2017	Situação	Fonte
A1	Levantar necessidade de capacitação de recursos humanos necessários para atuação nas atividades de gestão dos serviços	M1	100% até 2019	Não realizado.	Em andamento	Prefeitura
A2	Instituir a Política Municipal de Saneamento Básico, no qual serão definidos as diretrizes para a adequada prestação dos serviços de saneamento do Município.	M2	100% até 2019	A Lei não foi sancionada.	Em andamento	Prefeitura
A3	Elaborar o Plano Diretor de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário	M3	100% até 2027	Está sendo revisto.	Em andamento	Prefeitura

- **Projeto 2 - Implantação do Sistema de Informações**

O **Quadro 14** apresenta as duas ações proposta para este projeto, com as respectivas metas para 2016 e 2019.

A ação A1 encontra-se com a situação cumprida. A ARCE enviou uma planilha eletrônica para o município realizar o acompanhamento do plano, no entanto, a planilha não foi preenchida. Quanto a ação A2, nada foi realizado. Como a meta é para o ano de 2019, encontra-se com a situação “em andamento”.

**Quadro 14 – Ações e Metas do Projeto 2.**

Projeto 2		Meta/Prazo		2017	Situação	Fonte
A1	Implementar a planilha eletrônica	M1	Imediato (2016)	Não realizado. A ARCE deve enviar novamente a planilha.	Cumprida	Prefeitura
A2	Implantar o Sistema de Informações	M2	100% até 2019	Não realizado.	Em andamento	Prefeitura

- **Projeto 3 - Projeto de Educação Sanitária e Ambiental no Município**

O Quadro 15 apresenta as cinco ações proposta para este projeto, com as respectivas metas.

As ações A1 a A5 estão classificadas como “em andamento”, dado que não foram disponibilizadas informações, por parte da Prefeitura, sobre o atendimento das metas.

**Quadro 15 – Ação e Meta do Projeto 3.**

Projeto 3		Meta/Prazo		2017	Situação	Fonte
A1	Capacitação de agentes multiplicadores	M1	Contínua	Sem informação.	Em andamento	Prefeitura
A2	Inserir a educação ambiental em todos os níveis de ensino	M2	Contínua	Sem informação.	Em andamento	Prefeitura
A3	Inclusão da Vigilância Sanitária nos processos educativos com as comunidades	M3	Contínua	Sem informação.	Em andamento	Prefeitura
A4	Criar práticas de educação ambiental comunitária: centros sociais, centros comunitários, etc.	M4	Contínua	Sem informação.	Em andamento	Prefeitura
A5	Realizar campanhas de incentivo e disseminação da importância do consumo e uso racional de água tratada, bem como da destinação adequada dos rejeitos	M5	Contínua	Sem informação.	Em andamento	Prefeitura


**5 . CONCLUSÕES**

O Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Santa Quitéria possui 15 projetos, totalizando 56 ações que devem ser realizadas para melhorar a prestação dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos.

A reunião de acompanhamento do Plano possibilitou verificar em que nível está a execução dos projetos propostos, quantas metas já foram cumpridas, cumpridas parcialmente, quantas estão em andamento e quantas a Prefeitura do Município já extrapolou a data estabelecida e não procedeu com nenhuma atividade.

O **Gráfico 1** apresenta um panorama do cumprimento das metas do plano. Verifica-se que, do total de ações propostas, aproximadamente 1,79% foram cumpridas e 98,21% estão em andamento.

**Gráfico 1 – Cumprimento das metas do PMSB de Santa Quitéria.**

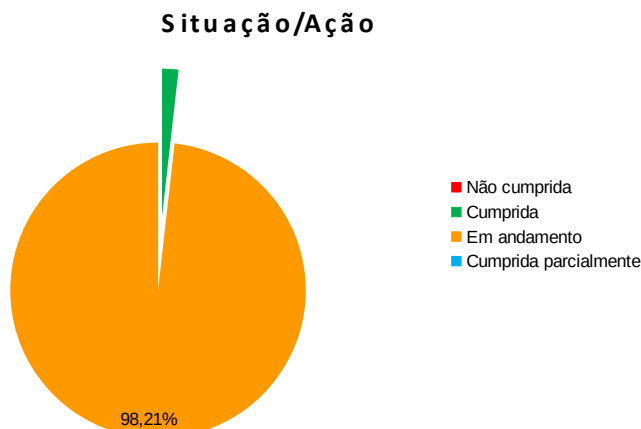

## 6 . EQUIPE TÉCNICA

Coordenador CSB/ARCE:

- Engenheiro Geraldo Basílio Sobrinho

Analistas de Regulação CSB/ARCE:

- Engenheiro Alexandre Caetano da Silva
- Engenheiro Marcelo Silva de Almeida
- Engenheiro Márcio Gomes Rebello Ferreira

Apoio Técnico à ARCE:

- Camila Cassundé Sampaio (Tecg<sup>a</sup> em Saneamento Ambiental – CSTA)

Responsável Pela Fiscalização:

**Engenheiro Marcelo Silva de Almeida**

Analista de Regulação

Matrícula: 127-1-8

Fortaleza – CE, 01 de Agosto de 2017.
