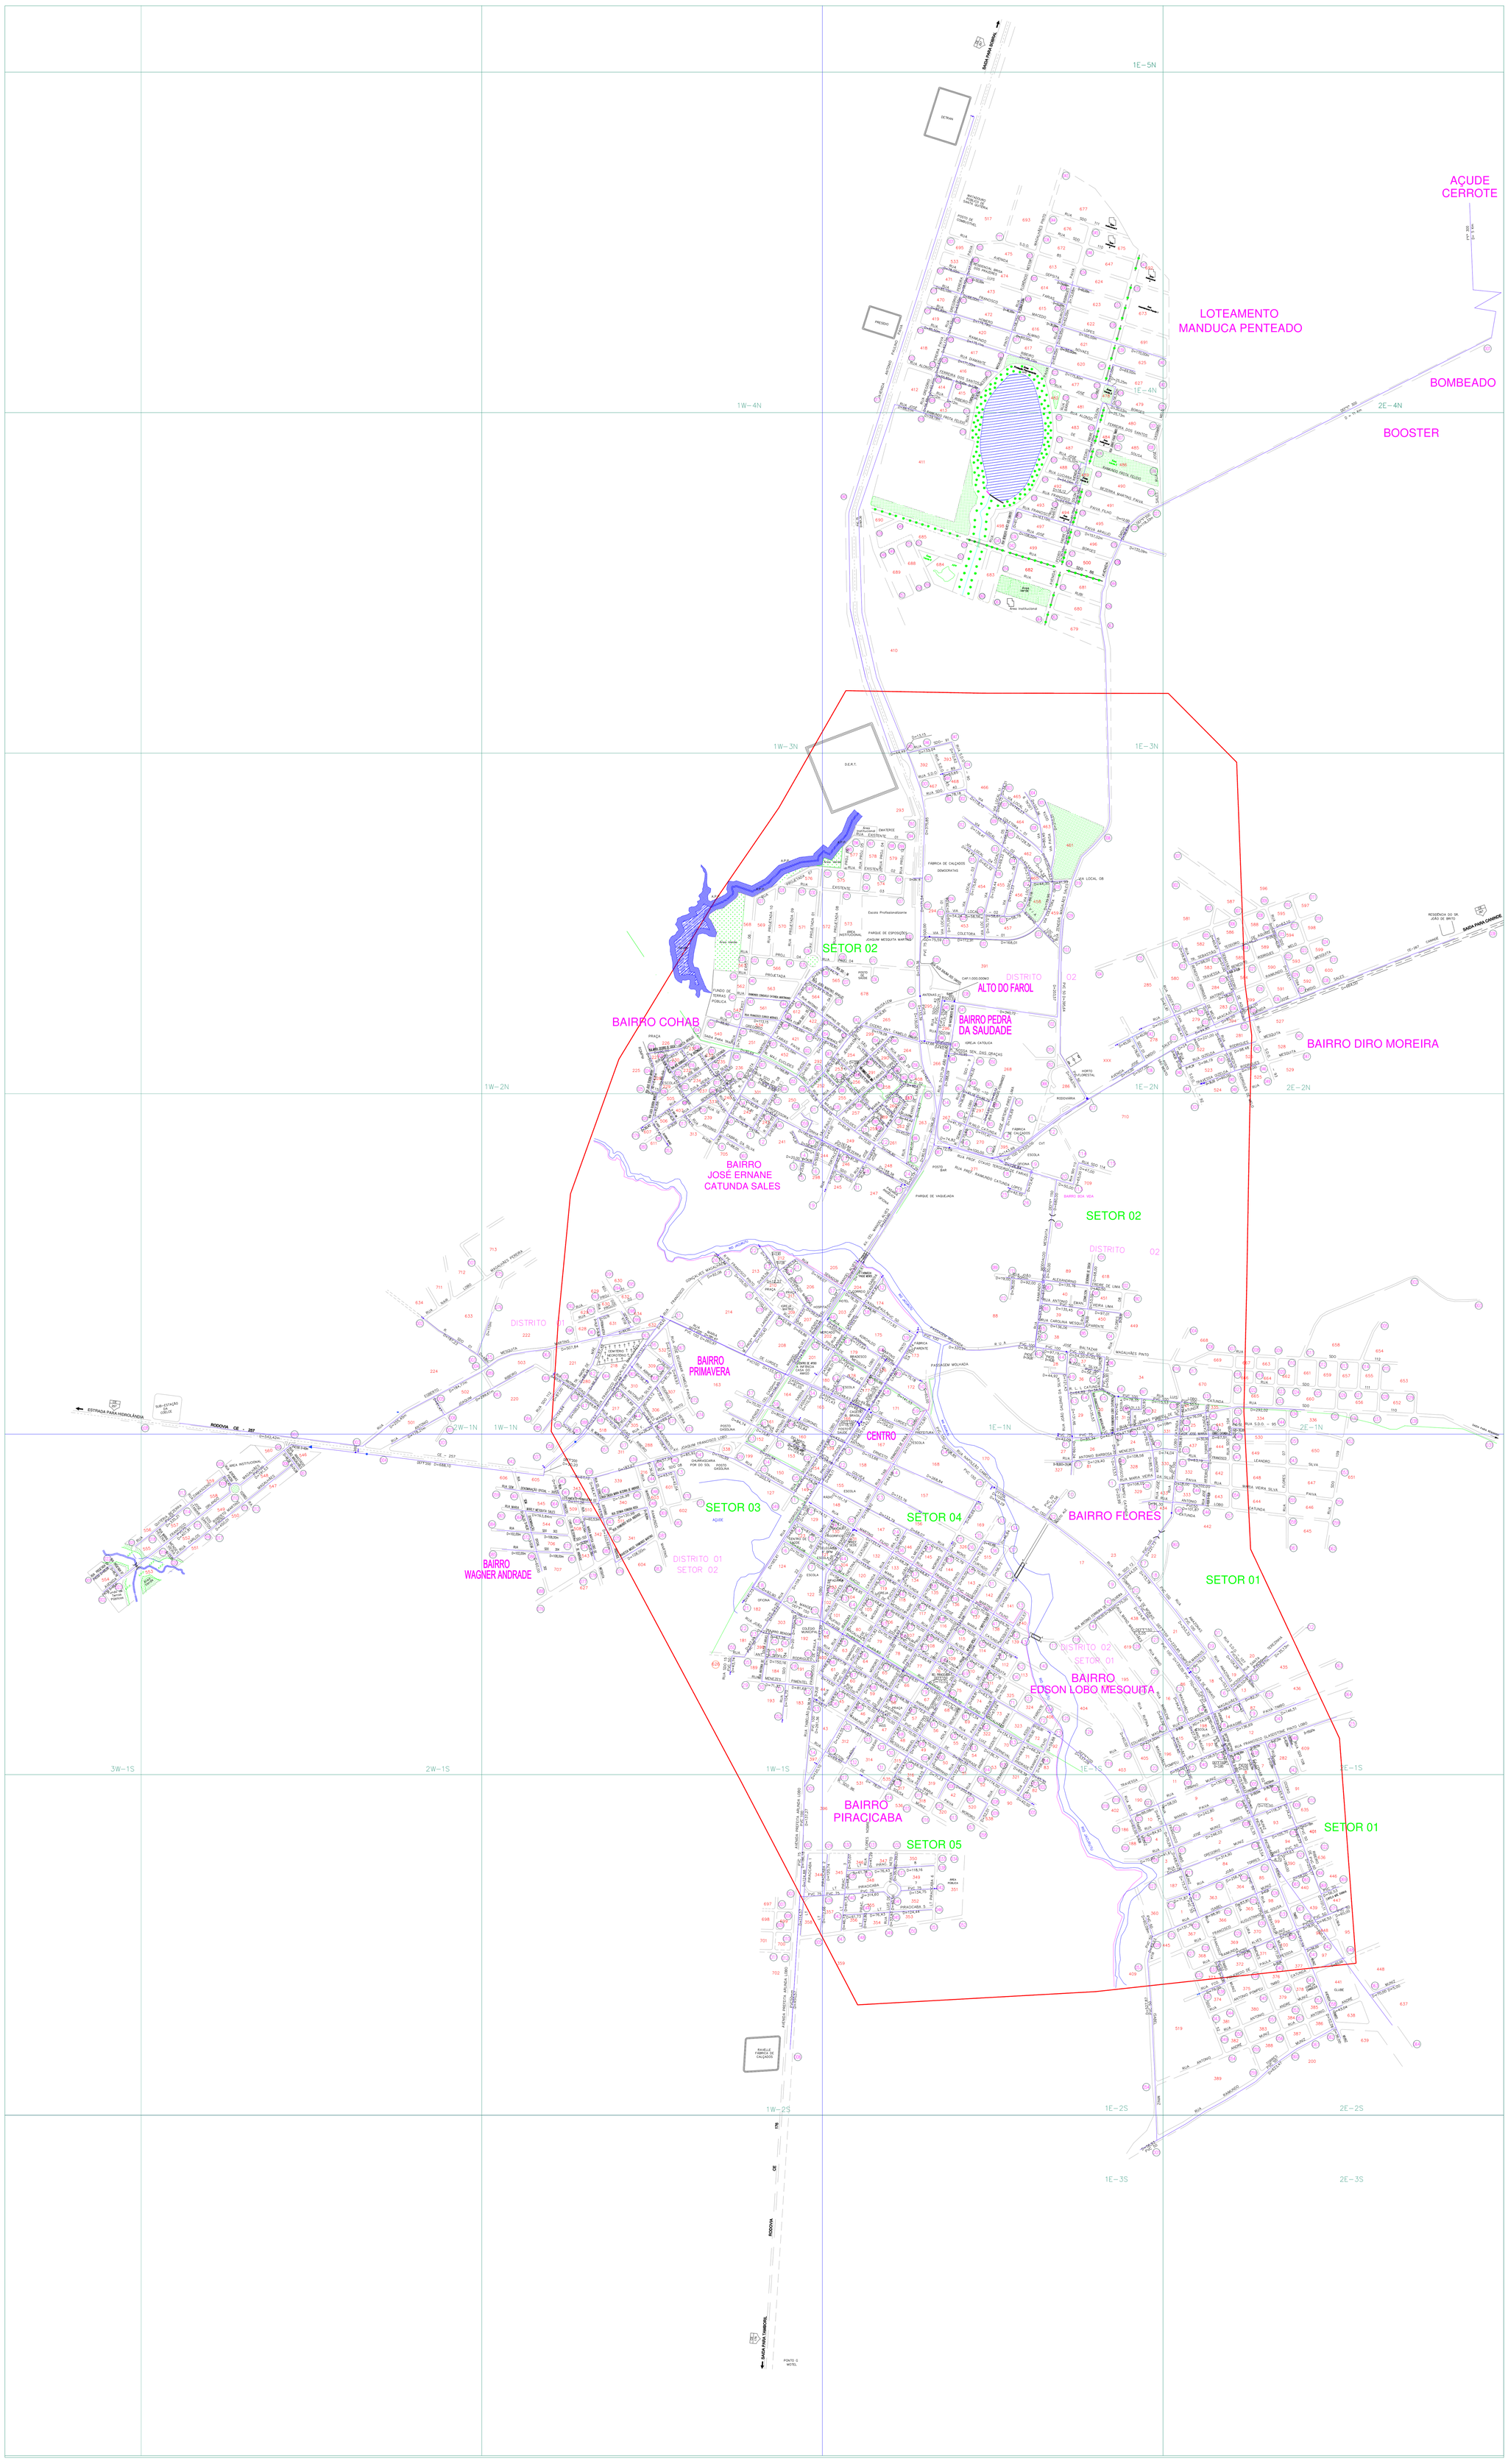

ARTICULAÇÃO DA FOLHA

				1E-5N		
			2E-4N	1E-4N		
			2E-3N	1E-3N		
			1W-2N	1E-2N	2E-2N	
		2W-1N	1W-1N	1E-1N	2E-1N	
	3W-1S	2W-1S	1W-1S	1E-1S	2E-1S	
				1E-2S	2E-2S	
				1E-3S	2E-3S	

NUMERAÇÃO DOS NÓS

QUADRÍCULA	Nº DE NÓS	QUADRÍCULA	Nº DE NÓS	QUADRÍCULA	Nº DE NÓS	QUADRÍCULA	Nº DE NÓS
1E-1N	115	1E-2S	058	2E-2N	049	2W-1N	008
1E-2N	106	1E-3S	001	2E-3N	002	2W-1S	023
1E-3N	064	1W-1N	100	2E-4N	001	3W-1S	002
1E-4N	047	1W-2N	055	2E-1S	064		
1E-5N	001	1W-1S	088	2E-2S	072		
1E-1S	143	2E-1N	044	2E-3S	001		

CONVENÇÕES

- ADUTORA
- SUB-ADUTORA
- REGISTRO
- MEDIDOR DE VAZÃO
- VENTOSA
- REGISTRO DE DESCARGA
- HIDRANTE
- REDES NÃO CONECTADAS
- EXTREMIDADE C/ CAP.
- CHAFARIZ
- LIMITE DE DISTRITO
- SETOR CENSITÁRIO
- LIMITE URBANO
- (XX) NUMERAÇÃO DO SETOR CENSITÁRIO
- (YY) NUMERAÇÃO DO CRUZAMENTO
- XXX NUMERAÇÃO DA QUADRA
- XY-ZK NUMERAÇÃO DA QUADRÍCULA

REDE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA

MATERIAL	DIAMETRO	EXTENSÃO (m)	MATERIAL	DIAMETRO	EXTENSÃO (m)
PVC	0025	40,58	PVC	0250	68,31
PVC	0040	87,82	DEFºFº	0100	468,53
PVC	0050	69.628,89	DEFºFº	0150	578,50
PVC	0075	3.952,97	DEFºFº	0250	1.625,13
PVC	0100	4.591,07	CA	0050	1.607,12
PVC	0150	1.879,08	CA	0150	363,75
PVC	0200	412,72			
Nº DE REGISTROS DE MANOBRA:		-			
Nº DE REGISTROS DE DESCARGA:		-			
			EXT. TOTAL:		85.405,97

OBS: – DIÂMETRO NÃO COTADO: PVC DN 50 mm

Controle Quantitativo das Extensões de Rede

REV.	TIPO	REDE ATUAL (m)	AMPLIAÇÃO (m)	TOTAL REDE (m)	DATA	RESPONSÁVEL
10	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO	84.665,47	578,50	85.405,97	MAI-2023	Adriana
09	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO	83.924,51	740,96	84.665,47	JUL-2022	Rogério
08	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO	83.856,17	68,34	83.924,51	FEV-2022	Rogério
07	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO	83.754,17	102,00	83.856,17	JAN-2022	Rogério
06	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO	83.304,63	449,54	83.754,17	OUT-2021	Rogério
05	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO	83.274,63	30,00	83.304,63	DEZ-2021	Rogério
04	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO	83.084,33	190,00	83.274,63	SET-2021	Rogério
03	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO	82.979,33	105,00	83.084,33	AGO-2021	Rogério
02	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO	82.949,33	30,00	82.979,33	JUL-2021	Rogério
01	MOVIMENTO/IMPLANTAÇÃO	81,185,59	1.763,74	82.949,33	MAI-2021	Rogério

Controle das Atualizações

REV.	NATUREZA DA REVISAO	ORIGEM	DATA	REVISAO	DIGITALIZAÇÃO	DATA	APROVACAO
10	IMPLANTAÇÃO DE REDE	UN-BAC	MAI-2023	CHARLES	CHARLES	MAI-2023	Adriana
09	IMPLANTAÇÃO DE REDE	UN-BAC	JUL-2022	CHARLES	CHARLES	JUL-2022	Rogério
08	IMPLANTAÇÃO DE REDE	UN-BAC	FEV-2022	CHARLES	CHARLES	FEV-2022	Rogério
07	IMPLANTAÇÃO DE REDE	UN-BAC	JAN-2022	CHARLES	CHARLES	JAN-2022	Rogério
06	IMPLANTAÇÃO DE REDE	UN-BAC	DEZ-2021	CHARLES	CHARLES	DEZ-2021	Rogério
05	IMPLANTAÇÃO DE REDE	UN-BAC	OUT-2021	CHARLES	CHARLES	OUT-2021	Rogério
04	IMPLANTAÇÃO DE REDE	UN-BAC	SET-2021	CHARLES	CHARLES	SET-2021	Rogério
03	IMPLANTAÇÃO DE REDE	UN-BAC	AGO-2021	CHARLES	CHARLES	AGO-2021	Rogério
02	IMPLANTAÇÃO DE REDE	UN-BAC	JUL-2021	CHARLES	CHARLES	JUL-2021	Rogério
01	IMPLANTAÇÃO DE REDE	UN-BAC	MAI2021	CHARLES	CHARLES	MAI-2021	Rogério
00	IMPLANTAÇÃO DE REDE	UN-BAC	ABR-2021	CHARLES	CHARLES	ABR-2021	Rogério

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ

DIRETORIA DE MERCADO E UNIDADE DE NEGÓCIO DA CAPITAL

GERÊNCIA DE CADASTRO E GEOPROCESSAMENTO

COORDENADORIA DE CADASTRO TECNICO

CADASTRO OPERACIONAL DO INTERIOR

PLANTA GERAL DE REDE DE ÁGUA

CIDADE: SANTA QUITÉRIA - COD. 048

UN-BAC: BACIA DO ACARAU E COREAÚ

GERENTE:	COORDENADOR:	DESENHO:
JOSELITO TELES	JEFFERSSON COSTA	ADRIANA LUZ
ESCALA: 1:5.000	PRANCHA: 01/01	DATA: MAIO-2023
