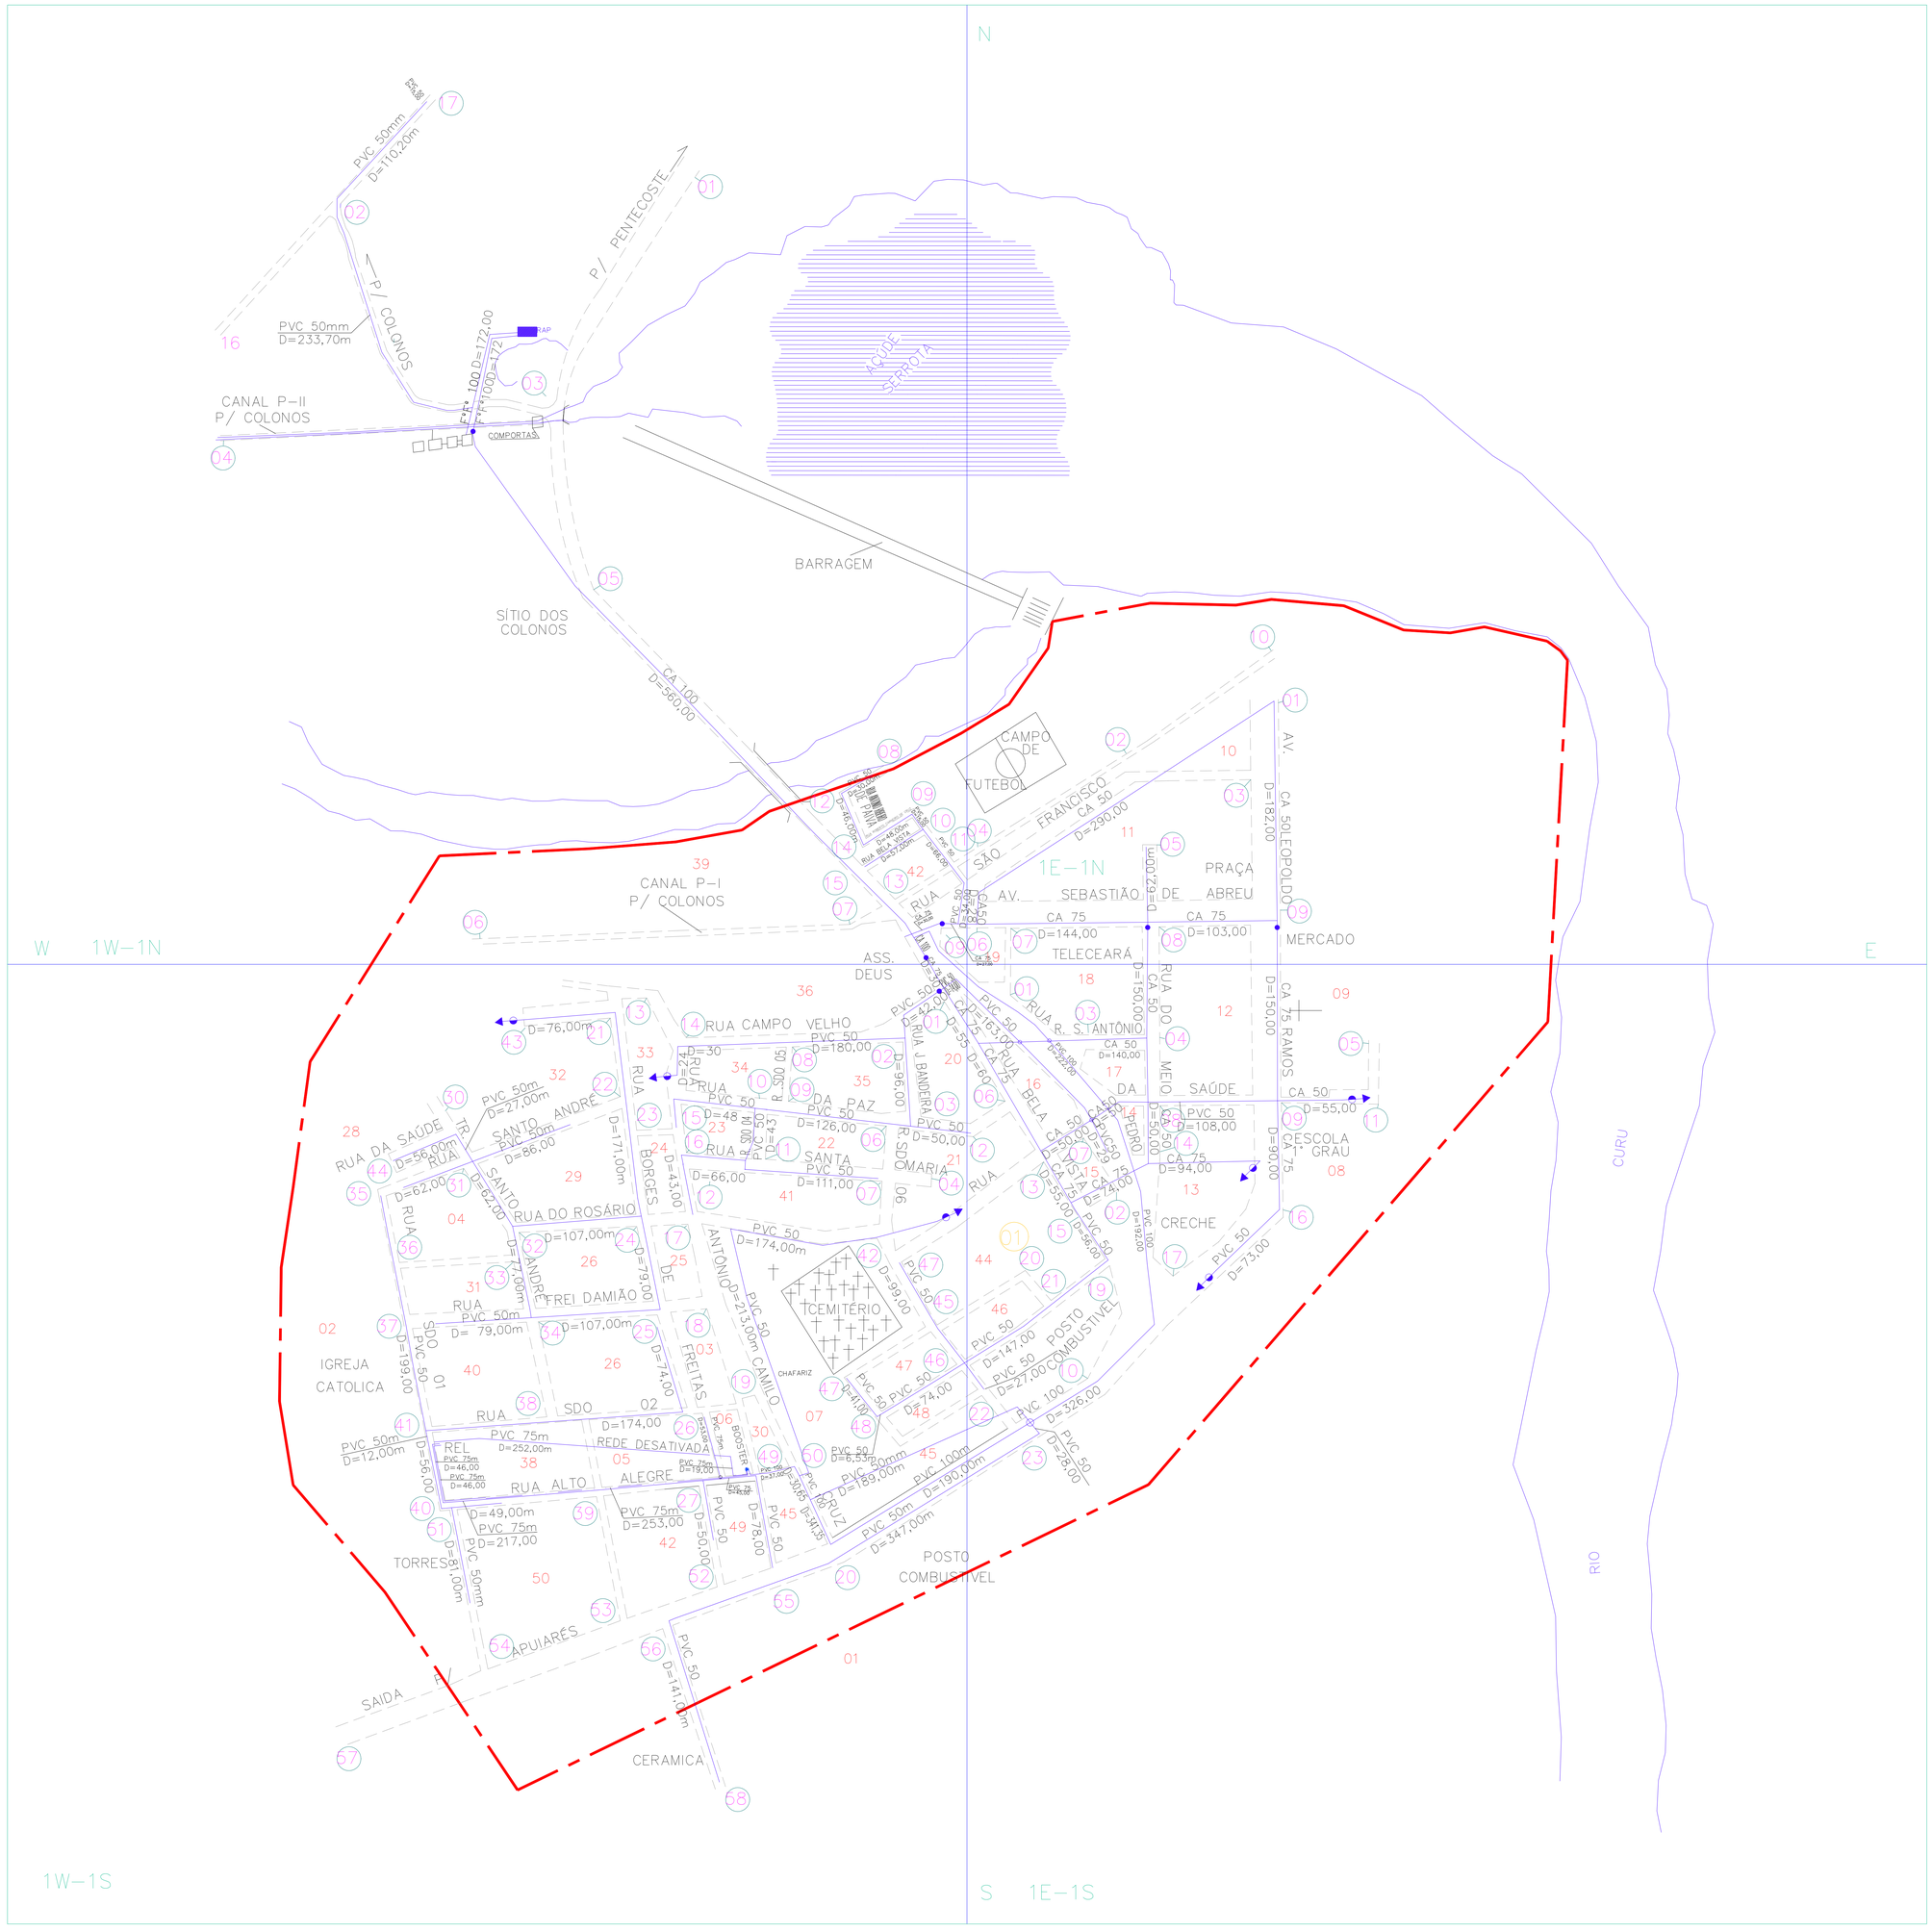

ARTICULAÇÃO DA FOLHA

	1W–1N	1E–1N	
	1W–1S	1E–1S	

NUMERAÇÃO DOS NÓS

QUADRÍCULA	Nº DE NÓS
1E–1N	010
1E–1S	017
1W–1N	016
1W–1S	046

CONVENCOES

- ADUTORA
- SUB–ADUTORA
- REGISTRO
- MEDIDOR DE VAZAO
- VENTOSA
- REGISTRO DE DESCARGA
- HIDRANTE
- REDES NAO CONECTADAS
- EXTREMIDADE C/ CAP.
- CHAFARIZ
- LIMITE DE DISTRITO
- SETOR CENSITARIO
- LIMITE URBANO
- XX — NUMERAÇÃO DO SETOR CENSITÁRIO
- YY — NUMERAÇÃO DO CRUZAMENTO
- XXX — NUMERAÇÃO DA QUADRA
- XY–ZK — NUMERAÇÃO DA QUADRÍCULA

	MATERIAL	DIAMETRO	EXTENSÃO (m)	MATERIAL	DIAMETRO	EXTENSÃO (m)
ADUTORA ÁGUA TRATADA	F°F°	0100	471,00			
			EXT. TOTAL:			**471,00**

	MATERIAL	DIAMETRO	EXTENSÃO (m)	MATERIAL	DIAMETRO	EXTENSÃO (m)
REDE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	PVC	0050	6.201,43	CA	0050	1.049,00
	PVC	0075	268,00	CA	0075	995,00
	PVC	0100	189,00	CA	0100	380,00
	F°F°	0100	172,00			
			EXT. TOTAL:			**9.725,43**

Controle Quantitativo das Extensões de Rede

REV.	TIPO	REDE ATUAL (m)	AMPLIAÇÃO (m)	TOTAL REDE (m)	DATA	RESPONSÁVEL
10						
09						
08	ATUALIZAÇÃO DE REDES	8.829,53	424,90	9.725,43	JAN–2024	Rogério Andrade
07	ATUALIZAÇÃO DE REDES	8.782,00	47.53	8.829,53	JAN–2023	Rogério Andrade
06	ATUALIZAÇÃO DE REDES	8.520,00	262,00	8.782,00	AGO–2021	Rogério Andrade
05	ATUALIZAÇÃO DE REDES	8.257,00	209,00	8.520,00	JUL–2021	Rogério Andrade
04	BALANÇO	8.020,00	237,00	8.257,00	JAN–19	Rogério Andrade
03	BALANÇO	5.659,00	1.361,00	8.020,00	MAIO/15	CIRLENE
02	BALANÇO	3.601,00	2.058,00	5.659,00	JUL/10	PEDRO
01	BALANÇO	3.601,00	–	3.601,00	OUT/03	PEDRO

OBS: Diâmetro não cotado PVC DN 50 mm

REV.	NATUREZA DA REVISAO	ORIGEM	DATA	REVISAO	DIGITALIZACAO	DATA	APROVACAO
09	ATUALIZAÇÃO	UN–BCL	JAN–2024	LEONARDO	LEONARDO	JAN/2024	Rogério Andrade
08	ATUALIZAÇÃO	UN–BCL	JAN–2023	NEILSON	NEILSON	JAN/2023	Rogério Andrade
07	ATUALIZAÇÃO	UN–BCL	AGO–2021	EDMILSON	EDMILSON	AGO–2021	Rogério Andrade
06	ATUALIZAÇÃO	UN–BCL	JUL–2021	EDMILSON	EDMILSON	JUL–2021	Rogério Andrade
05	ATUALIZAÇÃO	UN–BCL	JAN–2019	NEILSON	NEILSON	JAN–2019	Rogério Andrade
04	REVISÃO GERAL	UN–BCL	MAIO/15	NEILSON	NEILSON	MAIO/15	CIRLENE
03	REVISÃO GERAL	UN–BCL	JUL/10	NEILSON	NEILSON	JUL/10	ROGERIO
02	REVISÃO GERAL	UN–BCL	–	ROGERIO	CIRLENE	AGO/08	ROGERIO
01	REVISÃO GERAL	UN–BCL	OUT/03	–	RAQUEL	OUT/03	MARILENE
00	REVISÃO GERAL	DEMET	17/12/98	MATILDE	CARLOS	22/12/98	MARILENE

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
DIRETORIA DE MERCADO E UNIDADE DE NEGÓCIO DA CAPITAL
GERÊNCIA DE CADASTRO E GEOPROCESSAMENTO
COORDENADORIA DE CADASTRO TECNICO

CADASTRO OPERACIONAL DO INTERIOR
PLANTA GERAL DE REDE DE ÁGUA
CIDADE: SEBASTIÃO DE ABREU - LOC 067
UN-BCL: BACIA DO CURU E LITORAL

GERENTE:	COORDENADOR:	DESENHO:
JOSELITO TELES	JEFFERSSON COSTA	ROGÉRIO ANDRADE
ESCALA: 1:2.000	PRANCHA: 01/01	DATA: JANEIRO/2024
